全省水利统计简报


(1-9月)


厅规划计划处

2018年10月08日

一、全省水利建设投资完成情况

2018年全省水利建设计划完成投资500亿元。至9月底,全省水利建设完成投资424.2亿元,完成率84.8%。

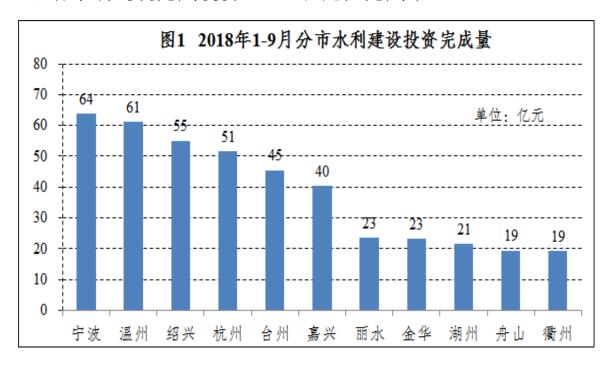


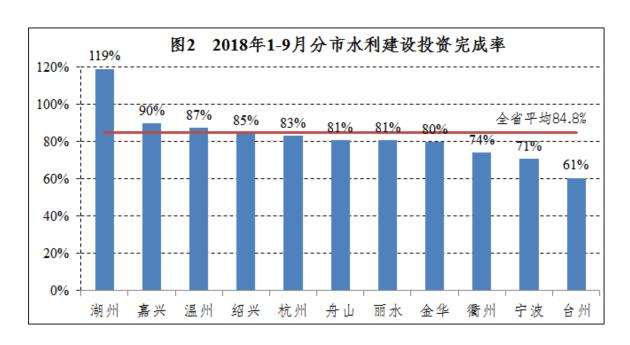

二、中央水利投资计划执行进展情况

2018年进展情况:至 09 月底,中央下达我省 2018年投资计划 44.6亿元,其中:中央资金 13.6亿元,完成投资 36.8亿元,完成率 82.6%;完成中央资金 12.8亿元、完成率 93.7%。

从分类看,大中型病险水库水闸加固、独流入海河流治理、小型病险水库除险加固、中小河流治理年度计划完成率较高(达到全省平均 83%以上);水电增效扩容、小型农田水利建设、基层防汛预报预警体系、江河湖库水系连通、水资源节约保护、水土流失治理、农业水价改革、水资源监控能力建设完成率较低(80%以下)。

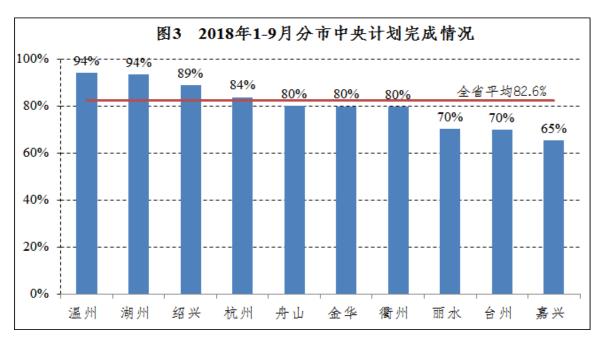

2018年度中央项目分类型完成情况


单位: 万元


		计划	下达	投资	完成	完成率	
序号	类型名称	年度	中央	计划	中央	年度	中央
		计划	资金	完成	完成	计划	资金
	总计	446222	136451	368718	127849	83%	94%
一、	中央预算内项目	50900	11900	49927	10500	98%	88%
1	大中型病险水闸除险加固	2000	1200	2000	1200	100%	100%
2	大中型病险水库除险加固	6900	2300	6425	2300	93%	100%
3	独流入海河流治理	42000	8400	41502	7000	99%	83%
_,	中央财政资金	395322	124551	318791	117349	81%	94%
1	小型病险水库除险加固	16587	2930	14653	2930	88%	100%
2	中小河流治理	177036	42540	153475	41380	87%	97%
3	河长制奖励资金	8204	4000	6704	3522	82%	88%
4	圩区标准化养护	4473	3077	3637	3077	81%	100%
5	山洪灾害防治	4515	2370	3635	2073	81%	87%
6	水电增效扩容	13446	6423	10190	5420	76%	84%
7	小型农田水利建设	99547	38755	75206	38125	76%	98%
8	基层防汛预报预警体系	4678	1053	3500	1023	75%	97%
9	江河湖库水系连通	45172	10065	33721	10065	75%	100%
10	水资源节约保护	7223	6000	5253	4344	73%	72%
11	水土流失治理	7956	3250	5583	3205	70%	99%
12	农业水价改革	4962	2765	2494	1465	50%	53%
13	水资源监控能力建设	1523	1323	740	720	49%	54%

三、百项千亿防洪排涝工程建设进展情况

1-9月,全省百项千亿防洪排涝工程在建71项,完成水利投资167.7亿元,年度投资完成率72.9%。宁波、绍兴、温州分别完成投资34.8亿元、31.7亿元和24.5亿元,湖州、杭州、温州、绍兴、宁波、丽水等6市完成年度投资计划75%以上,已达到时序进度要求。台州市年度投资完成率低于50%,进度持续明显滞后。9月,桐庐县富春江干堤加固三期工程、临安市双溪口水库工程、金华市本级金华江治理二期工程新开工建设。

加快推进前期 18 项。可研已批未开工 11 项,各地要抓紧做好各项开工准备工作,及早开工建设。

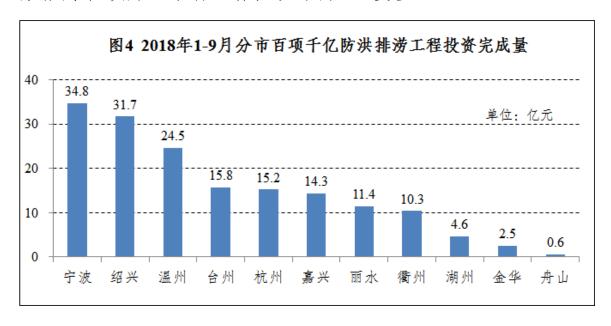

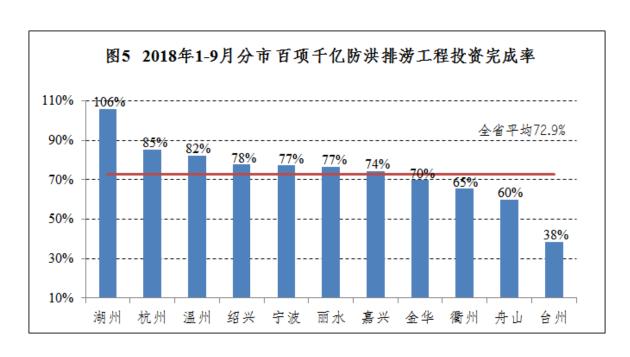

四、面上建设任务指标完成情况

海塘干堤加固:全年计划完成100公里,已完工79.3公里、完成率79.3%;其中海塘18公里、干堤61.3公里;

水库加固:全年计划完成 100 座,已完成 94 座、完成 率 94.0%;

圩区整治:全年计划完成 30 万亩,已完成 22.4 万亩、 完成率 74.7%;

山塘整治:全年计划完成500座,已完成363座、完成率72.6%。

农村饮水安全提升:全年计划完成 100 万人,已完成 86.8 万人、完成率 86.8%。

高效节水面积:全年计划完成 25 万亩,已完成 23.7 万亩、完成率 94.8%。

小水电站生态治理:全年计划完成19座,已完成10座、

完成率 52.6%:

河道综合整治:全年计划完成 500 公里,已完成 551.2 公里,完成率 110.2%;河湖库塘清淤:全年计划完成 7000 万方,已完成 7278.8 万方、完成率 104.0%。

五、面上资金分解情况

2017年10月提前下达2018年第一批面上省级资金,尚有3个县市区未完成分解。3月下达的第二批面上资金,有8个县市区未完成分解工作。各地要按照有关文件要求,商同级财政尽快分解下达面上任务和资金,并按要求抄送省水利厅、财政厅。

2018年面上水利建设与管理任务省级资金分解情况

序号	地市	未完成第一批分解地区	未完成第二批分解地区
1	杭州	萧山区	萧山区
2	温州	文成县	瑞安市、文成县
3	金华	永康市	武义县
4	舟山	/	定海区
5	台州	/	市本级
6	衢州	/	江山市
7	丽水	/	云和县

附件: 1.全省水利建设投资完成情况表

- 2.全省百项千亿水利项目进展情况表(建设类)
- 3.全省百项千亿水利项目进展情况表(前期类)

2018年全省水利建设投资完成情况表

		年度	 投资计划	及完成	 情况		中央	投资计划	及完成情	 情况	
序号	市、县(市、 区)	年度 目标	省级资金	1~9月 完成投 资	1~9月 投资完	年度计划	中央资金	完成年 度计划	完成中 央资金		金完成
		亿元	亿元	亿元	成率	万元	万元	万元	万元	率	率
	总计	500	81.03	424.20	85%	446222	136451	368697	127829	83%	94%
_	省本级	1	1	1	1	1523	1323	720	700	1	/
1	省属	/	1	1	1	1523	1323	720	700	/	/
11	杭州	62	9.07	51.49	83%	24248	8655	20335	8389	84%	97%
2	杭州市本级	29	1.64	24.23	84%	/	/	/	/	/	/
3	萧山区	8	4.61	7.38	92%	/	/	/	/	/	/
4	余杭区	6	0.24	4.70	78%	220	220	110	110	50%	50%
5	富阳区	5.5	0.35	3.19	58%	1127	200	1127	200	100%	100%
6	桐庐县	2.5	0.28	1.87	75%	910	220	822	220	90%	100%
7	建德市	3.8	0.61	2.74	72%	6246	1890	4591	1794	74%	95%
8	淳安县	2.2	0.76	3.21	146%	13380	3760	11380	3760	85%	100%
9	临安区	5	0.58	4.16	83%	2365	2365	2305	2305	97%	97%
=	宁波	90	0.00	63.81	71%	/	/	/	/	/	/
10	宁波市本级	54	0.00	37.65	70%	/	/	/	/	/	/
11	慈溪市	9	0.00	7.33	81%	/	/	/	/	/	/
12	余姚市	10	0.00	7.81	78%	/	/	/	/	/	/
13	宁海县	12	0.00	7.91	66%	/	/	/	/	/	/
14	象山县	5	0.00	3.10	62%	/	/	/	/	/	/
四	温州	70	10.48	61.23	87%	72415	20255	68298	19107	94%	94%
15	温州市本级	11.2	0.50	8.94	80%	/	/	/	/	/	/
16	鹿城区	9.3	1.04	8.81	95%	4000	800	3200	0	80%	0%
17	瓯海区	6.5	0.63	5.81	89%	3118	1050	2806	1050	90%	100%
18	龙湾区	2.6	0.23	2.20	85%	170	170	112	112	66%	66%
19	洞头区	0.8	0.03	0.84	105%	380	100	380	100	100%	100%
20	乐清市	6.5	0.10	6.26	96%	3953	990	3591	750	91%	76%
21	瑞安市	5.5	0.87	4.14	75%	115	115	115	115	100%	100%
22	永嘉县	7.2	1.21	6.93	96%	510	510	460	460	90%	90%
23	平阳县	10.2	3.73	8.55	84%	22265	5770	23507	5770	106%	100%
24	苍南县	6.3	1.06	4.92	78%	12510	3620	12320	3620	98%	100%
25	文成县	1.7	0.32	1.71	100%	19747	4650	18177	4650	92%	100%
26	泰顺县	2.2	0.75	2.13	97%	5647	2480	3630	2480	64%	100%
五	嘉兴	45	5.84	40.41	90%	43712	14850	28587	14418	65%	97%

		年度	——— 投资计划]及完成	 情况		中央	———— 投资计划	及完成情	 情况	
序号	市、县(市、 区)	年度目标	省级资金	1~9月 完成投 <u>资</u>	1~9月 投资完 成率	年度计划	中央资金	完成年度计划	完成中央资金	年度计 划完成 率	中央资金完成率
27	= "/ /	亿元	亿元	亿元		万元	万元	万元	万元		·
27	嘉兴市本级	23.9	0.59	18.55	78%	/	/	/	/	/	/
28	南湖区	1.4	0.13	1.31	94%	4963	1590	2608	1489	53%	94%
29	秀洲区	6	2.24	5.06	84%	4482	2040	3093	1980	69%	97%
30	海宁市	2.6	0.32	3.09	119%	6806	2071	5348	2071	79%	100%
31	平湖市	2.1	0.57	1.82	86%	2956	896	2625	625	89%	70%
32	桐乡市	1.5	0.25	1.44	96%	11586	4080	7593	4080	66%	100%
33	嘉善县	3.3	0.96	3.34	101%	10099	2650	4500	2650	45%	100%
34	海盐县	4.2	0.79	5.80	138%	2820	1523	2820	1523	100%	100%
六	湖州	18	5.87	21.45	119%	89259	23258	83470	23031	94%	99%
35	湖州市本级	2.3	1.11	2.55	111%	/	/	/	/	/	/
36	吴兴区	1.5	0.21	1.59	106%	3200	1070	2590	1070	81%	100%
37	南浔区	1.8	0.80	2.92	162%	14045	3877	12705	3877	90%	100%
38	德清县	5	2.34	5.36	107%	46960	11806	44140	11579	94%	98%
39	安吉县	2	0.69	1.81	91%	5649	2620	5105	2620	90%	100%
40	长兴县	5.4	0.72	7.21	134%	19405	3885	18930	3885	98%	100%
七	绍兴	65	9.71	55.08	85%	16796	5681	14932	5591	89%	98%
41	绍兴市本级	7.5	4.08	5.06	67%	/	/	/	/	/	/
42	越城区	17.5	0.00	11.39	65%	480	120	270	90	56%	75%
43	柯桥区	9.5	2.11	8.58	90%	650	480	650	480	100%	100%
44	上虞区	9	0.85	8.76	97%	190	100	152	100	80%	100%
45	诸暨市	10.5	1.44	9.94	95%	9059	2411	8323	2411	92%	100%
46	嵊州市	7.5	0.75	5.85	78%	977	300	967	300	99%	100%
47	新昌县	3.5	0.48	5.50	157%	5440	2270	4570	2210	84%	97%
八	金华	29	5.39	23.20	80%	49156	13301	39300	12613	80%	95%
48	金华市本级	3.2	0.84	1.81	57%	10	10	10	10	100%	100%
49	婺城区	3.5	0.17	2.57	73%	17181	2905	15051	2905	88%	100%
50	金东区	3.1	0.29	2.35	76%	11074	1610	7600	1610	69%	100%
51	兰溪市	5.2	2.46	3.28	63%	998	195	685	144	69%	74%
52	东阳市	2.6	0.42	2.51	96%	3281	1940	3281	1940	100%	100%
53	义乌市	5.2	0.23	4.52	87%	818	390	721	293	88%	75%
54	永康市	2.6	0.27	2.50	96%	5319	2670	4689	2390	88%	90%
55	浦江县	1.2	0.25	1.10	91%	2191	1421	1861	1371	85%	96%
56	武义县	1.2	0.28	1.52	126%	6839	1540	4632	1330	68%	86%
57	磐安县	1.2	0.18	1.05	87%	1445	620	770	620	53%	100%
九	舟山	24	4.87	19.42	81%	37458	8510	30046	7649	80%	90%

		年度	 投资计划	 及完成	情况		中央	 投资计划	及完成情	 身况	
序号	市、县(市、 区)	年度目标	省级资金	1~9月 完成投 资	1~9月 投资完 成率	年度计划	中央资金	完成年度计划	完成中央资金	年度计 划完成 率	中央资金完成率
		亿元	亿元	亿元		万元	万元	万元	万元		, and the second
58	舟山市本级	5.4	1.54	4.37	81%	538	80	82	80	15%	100%
59	定海区	2.8	1.69	2.62	94%	18029	3550	17476	3411	97%	96%
60	普陀区	4.2	0.87	3.53	84%	15290	2940	10020	2668	66%	91%
61	岱山县	11.2	0.59	8.59	77%	3300	1640	2318	1340	70%	82%
62	嵊泗县	0.4	0.17	0.31	77%	300	300	150	150	50%	50%
十	台州	75	11.80	45.44	61%	17058	6240	11943	4769	70%	76%
63	台州市本级	32.6	3.97	15.74	48%	/	/	/	/	/	/
64	椒江区	3.8	0.10	3.75	99%	380	280	155	135	41%	48%
65	黄岩区	5.3	1.63	3.55	67%	697	430	356	310	51%	72%
66	路桥区	4.6	1.62	3.00	65%	220	220	176	176	80%	80%
67	温岭市	4.6	1.05	3.56	77%	1420	525	1057	343	74%	65%
68	临海市	8.5	1.18	5.23	62%	757	175	672	90	89%	51%
69	三门县	3	0.63	0.87	29%	4935	1390	1442	590	29%	42%
70	天台县	6.2	0.57	4.30	69%	625	290	581	290	93%	100%
71	仙居县	4.2	0.97	3.22	77%	7634	2540	7114	2445	93%	96%
72	玉环市	2.2	0.08	2.22	101%	390	390	390	390	100%	100%
+-	衢州	26	10.89	19.25	74%	48027	12235	38361	11880	80%	97%
73	衢州市本级	2	0.55	1.21	61%	631	320	133	133	21%	42%
74	柯城区	3	1.17	1.72	57%	572	300	542	270	95%	90%
75	衢江区	3.3	0.89	2.75	83%	21151	4295	12851	4295	61%	100%
76	江山市	5.7	2.96	4.10	72%	3313	1810	2156	1732	65%	96%
77	龙游县	5	1.56	3.68	74%	7800	2150	5540	2140	71%	100%
78	常山县	4	1.87	3.33	83%	3054	1420	2349	1420	77%	100%
79	开化县	3	1.89	2.46	82%	11507	1940	14790	1890	129%	97%
十二	丽水	29	7.12	23.45	81%	46570	22143	32705	19682	70%	89%
80	丽水市本级	6.3	0.23	2.82	45%	/	/	/	/	/	/
81	莲都区	2.8	0.40	0.99	35%	3907	1820	2332	1820	60%	100%
82	龙泉市	2	1.11	2.09	105%	8609	2960	6624	2925	77%	99%
83	青田县	4	0.34	3.41	85%	6492	1090	3115	1027	48%	94%
84	云和县	1	0.27	0.76	76%	8159	2893	3960	1860	49%	64%
85	庆元县	2.7	0.85	2.38	88%	2500	2500	2130	2130	85%	85%
86	缙云县	3.2	1.47	4.11	128%	3070	3070	2780	2780	91%	91%
87	遂昌县	2	0.99	2.61	130%	9993	4820	8594	4550	86%	94%
88	松阳县	4	1.14	3.44	86%	2130	2130	1760	1760	83%	83%
89	景宁县	1	0.33	0.85	85%	1710	860	1410	830	82%	97%

2018年"百项千亿"水利项目进展情况表(建设类)

单位:万元

				截至2017	2	2018年计划]
序号	县市区	项目名称	总投资	年底累计 完成投资	年度 目标	1-9月完 成投资	年度目标 完成率
		合计	16585735	4509851	2300000	1676494	72.9%
1	杭州、嘉 兴、湖州	扩大杭嘉湖南排工程	792735	516097	88000	75667	86%
(1)	杭州市 本级	扩大杭嘉湖南排工程(八堡泵站)	129000	/	10000	14000	100%
(2)	嘉兴市 本级	扩大杭嘉湖南排工程(嘉兴 段)	454300	310431	70000	54296	69%
(3)	德清县	扩大杭嘉湖南排工程(德清 段)	100805	92636	8000	7371	81%
2	湖州	苕溪清水入湖河道整治工程	740000	432958	30000	28070	94%
(1)	长兴县	苕溪清水入湖河道整治工程 (长兴段)	289418	263430	25000	23180	85%
(2)	安吉县	苕溪清水入湖河道整治工程 (安吉段)	185600	169528	5000	4890	96%
3	湖州市 本级	苕溪清水入湖河道整治后续工 程	218000	30000	5000	10100	202%
4	柯桥区	柯桥区瓜渚湖直江柯北段拓浚 工程	116000	33000	70000	77881	111%
5	仙居县	仙居县盂溪水库工程	27000	34650	1000	1007	101%
6	台州市 本级	台州市东官河综合整治工程	233000	139521	50000	50300	101%
7	青田县	青田县青田水利枢纽工程	160000	101900	20000	20000	100%
8	嵊州市	嵊州市湛头滞洪区改造工程	129000	90000	28800	28680	100%
9	瑞安市	瑞安市飞云江治理一期工程	96000	101308	12000	11898	99%
10	永嘉县	温州市乌牛溪(永乐河)治理 工程	72000	28223	23000	21985	96%
11	杭州市 本级	杭州市大江东钱塘江标准塘工程	102000	78371	25300	24064	95%
12	龙湾区 经开区	温州市温瑞平原东片排涝工程	355000	74793	17000	16111	95%
13	萧山区	杭州市萧山区浦阳江治理工程	425000	197932	56000	52355	93%
14	乐清市	乐清市乐柳虹平原排涝工程	170000	5050	3000	2751	92%
15	缙云县	缙云县潜明水库一期工程	161000	107800	27000	24600	91%
16	余姚市	余姚市姚江城区段堤防加固工 程	86000	/	20000	17870	89%

				截至2017	,	2018年计划	Ŋ
序号	县市区	项目名称	总投资	年底累计 完成投资	年度 目标	1-9月完 成投资	年度目标 完成率
17	鹿城区	鹿城区瓯江绕城高速至卧旗山 段海塘加固工程	188000	108640	50000	43988	88%
18	文成县	文成县飞云江治理工程二期	27000	19000	8300	7300	88%
19	鹿城区 瓯海区	温州市温瑞平原西片排涝工程	246000	64525	60000	51566	86%
20	萧山区	杭州市萧山区蜀山片外排工程	172000	5000	11000	9449	86%
21	奉化市	宁波市葛岙水库工程	442000	/	80000	68700	86%
22	苍南县	苍南县江南垟平原骨干排涝工 程	242000	34890	20000	16665	83%
23	龙泉市	龙泉市龙泉溪治理二期工程	27000	15661	9500	7900	83%
24	鹿城区	鹿城区戍浦江河道(藤桥至河 口段)整治工程	91000	76530	29000	24000	83%
25	宁波市 本级	宁波市姚江二通道(慈江)工 程	248000	/	70000	56919	81%
26	龙游县	龙游县高坪桥水库工程	99000	61000	23000	18500	80%
27	兰溪市	兰溪市钱塘江堤防加固工程	136000	65000	25000	20037	80%
28	临海市	临海市大田平原排涝一期工程	133000	96614	20000	16020	80%
29	上虞区	上虞区虞北平原滨江河-沥北河 整治工程	95000	89030	8000	6405	80%
30	遂昌县	遂昌县清水源水库工程	58000	6000	15000	12000	80%
31	浙东局	姚江上游西排工程	123000	37842	25000	19824	79%
32	诸暨市	诸暨市高湖蓄滞洪区改造工程	220000	160500	40000	31703	79%
33	平阳县	鳌江干流治理平阳县水头段防 洪工程	167000	47005	44000	34743	79%
34	松阳县	松阳县黄南水库工程	181000	104442	38000	30000	79%
35	江山市	江山市江山港综合治理工程	224000	33008	40000	31460	79%
36	越城区	绍兴市新三江闸排涝配套河道 拓浚工程(越城片)	262000	129284	70000	55000	79%
37	诸暨市	诸暨市浦阳江治理二期工程	74000	12000	35000	26950	77%
38	上虞区	上虞区虞东河湖综合整治工程	120000	53500	27500	20985	76%
39	嘉兴市 本级	嘉兴市平湖塘延伸拓浚工程	357000	320135	25000	18913	76%
40	余姚市	余姚市扩大北排工程	450000	/	40000	30250	76%

				截至2017	,	2018年计划	Ŋ
序号	县市区	项目名称	总投资	年底累计 完成投资	年度 目标	1-9月完 成投资	年度目标 完成率
41	建德市	建德市新安江、兰江治理工程	17000	12818	10000	7559	76%
42	丽水市 本级	丽水市大溪治理工程	77000	63808	2000	1490	75%
43	慈溪市	慈溪市北排工程	612000	/	70000	51990	74%
44	嘉善县 秀洲区	嘉兴市北部湖荡整治及河湖连 通工程	250000	15739	57000	42284	74%
45	宁波市 本级	宁波市鄞奉平原排涝工程	715000	/	140000	103074	74%
46	临海市	临海市方溪水库工程	115000	91634	15000	11019	73%
47	嘉兴市 本级	嘉兴市南排闸站除险加固工程	33000	10081	5300	3843	73%
48	富阳区	杭州市富阳区富春江治理工程	289000	152944	25000	18000	72%
49	海盐县	海盐县东段围涂标准海塘工程	34000	6084	25000	17898	72%
50	常山县	常山县常山港治理二期工程	88000	10158	30000	20128	67%
51	越城区	绍兴市袍江片东入曹娥江排涝 工程	256000	112000	20000	12900	65%
52	余姚市	余姚市姚江上游西分工程	195000	/	30000	19000	63%
53	定海区	舟山群岛新区定海强排工程	72000	14166	11000	6365	60%
54	平湖市	平湖市白沙湾至水口标准海塘 工程	35000	/	10000	5700	57%
55	绍兴市 本级	绍兴市马山闸强排及配套河道 建设工程	233000	/	100000	56500	57%
56	台州市 本级	台州市朱溪水库工程	374000	113800	90000	50083	56%
57	衢州市	衢州市本级衢江治理二期工程	142000	54300	25000	13370	53%
58	永嘉县	永嘉县瓯北三江标准堤工程	173000	100821	15000	7934	53%
59	龙游县	龙游县衢江治理二期工程	54000	20800	20000	10000	50%
60	三门县	三门县东屏水库工程	70000	24664	15000	4563	30%
61	丽水市 本级	丽水市大溪治理提升改造工程	100000	2000	17000	5160	30%
62	椒江区	台州市洪家场浦强排工程	217000	26300	50000	15000	30%
63	温岭市	温岭市南排工程	364000	25200	30000	6360	21%
64	桐庐县	桐庐县富春江干堤加固二期工 程	51000	24789	1500	200	13%

				截至2017		2018年计戈	IJ
序号	县市区	项目名称	总投资	年底累计 完成投资	年度 目标	1-9月完 成投资	年度目标 完成率
65	路桥区	台州市路桥区青龙浦排涝工程	210000	50578	45000	2178	5%
66	黄岩区	台州市黄岩区北排工程	315000	13650	30000	1000	3%
67	台州市 本级	台州市永宁江闸强排工程	115000	2850	20000	200	1%
68	台州市 本级	台州市七条河拓浚工程	156000	3400	20000	0	0%
69	桐庐县	桐庐县富春江干堤加固三期工程	24000	1000	4500	1380	31%
70	临安区	临安区双溪口水库工程	51000	1160	5000	2000	40%
71	金华市 本级	金华市本级金华江治理二期工程	93000	9300	10000	4500	45%
72	青田县	青田县瓯江治理二期工程	21000	/	5000	1100	22%
73	杭州市 本级	杭州市大江东片外排工程	121000	32900	30000	23000	77%
74	庆元县	庆元县兰溪桥水库扩建工程	150000	/	15000	11600	77%
75	平阳县	平阳县瑞平平原排涝工程	140000	/	10000	6500	65%
76	柯城区	衢州市柯城区常山港治理工程	100000	1700	20000	10000	50%
77	临海市	临海市大田平原排涝二期工程	270000	/	5000		程初设已 未开工
78	上虞区	绍兴市上虞区崧北河综合治理 工程	66000	/	3000	可研已拙	1,未开工
79	临海市	临海市东部平原排涝工程	179000	/	5000		已批,未工
80	河道总站 钱管局	海宁市秧田庙至塔山坝段海塘 工程	20000	/	新开工	堤脚加固	初设已审
81	瑞安市	瑞安市温瑞平原南部排涝工程	200000	/	2000		已批;二 案研究
82	鹿城区	温州市鹿城区瓯江治理二期工 程	90000	/	新开工	可研	已审
83	台州市 本级	台州市灵江扩排挡潮工程	1047000	/	15000	一期可研在编	
84	苍南县 平阳县	温州市江西垟平原排涝工程	187000	/	5000	期可研意	已批;二 见已出, 方案研究
85	绍兴市 本级	绍兴市曹娥江综合整治工程	200000	/	5000	可研	已审

注: 年度完成率低于时序要求的为滞后项目,其中红色为严重滞后,黄色为一般滞后。

附件3

2018年"百项千亿"水利项目进展情况表(前期类)

序号	县(市 、区)	项目名称	年度目标	当月计划目标	1-9月完成情况	进展情况
1	湖州市 本级	太嘉河及杭嘉湖环湖 河道整治后续工程	力争完成可研批复	力争完成可研批 复	可研已批	正常
2	湖州市本级	环湖大堤(浙江段) 后续工程	按照国家要求开 展,力争完成可研 批复	按照国家要求开展	可研已复审,规划 选址已办理,移民 安置规划报告已报 部,土地踏勘论证 报告已审	正常
3	开化县	开化县开化水库工程	按照国家要求开 展,力争完成可研 批复	按照国家要求开 展	可研已复审,移民 安置规划大纲已 审,规划选址已获 批	正常
4	宁海县 天台县 三门县	清溪水库工程	加快推进可研工作	开展可研编制	可研在编	正常
5	磐安县	磐安县流岸水库工程	完成可研批复	完成环境影响评 价、土地预审批 复	可研已审意见已 出,规划选址已办 理,土地预审已报 部;移民规划大纲	正常
6	义乌市	双江水利枢纽工程	完成可研批复	完成土地预审批 复	可研已审; 规划选址已办理	正常
7	永嘉县	永嘉县南岸水库	按照国家要求开展	按照国家要求开 展	可研在编	正常
8	嘉兴市 本级	太浦河后续工程(浙 江段)	按照国家要求开展	按照国家要求开 展	可研在编	正常
9	龙湾区	温州市龙湾区瓯江标 准海塘提升改造工程	完成可研批复	完成环评、水保 、规划选址批复	可研已审	正常
10	嘉善县	嘉兴市中心河拓浚及 河湖连通工程	完成可研批复	土地预审报批	可研已审意见已 出;规划选址已办 理	滞后
11	磐安县 永康市	磐安县虬里水库工程	加快推进可研工作	开展可研编制	可研在编	滞后
12	瑞安市	瑞安市飞云江治理二 期工程	完成可研批复	完成规划选址、 土地预审批复	可研已审	滞后
13	温岭市	温岭九龙汇调蓄工程	完成可研审查, 力争完成可研批复	完成可研编制	可研在编	滞后
14	临海市	台州市椒江治理工程 (临海段)	完成可研批复	完成土地预审批 复	可研已审	滞后
15	台州市 本级	台州市金清港强排工 程	加快推进可研工作	开展可研编制	可研在编	滞后

注: 年度完成率低于时序要求的为滞后项目, 其中红色为严重滞后, 黄色为一般滞后。
