

# 全省水利统计简报


(1-7月)


厅规划计划处

2018年8月10日

## 一、全省水利建设投资完成情况

2018年全省水利建设计划完成投资500亿元。至7月底，全省水利建设完成投资315.4亿元，完成率63.1%。

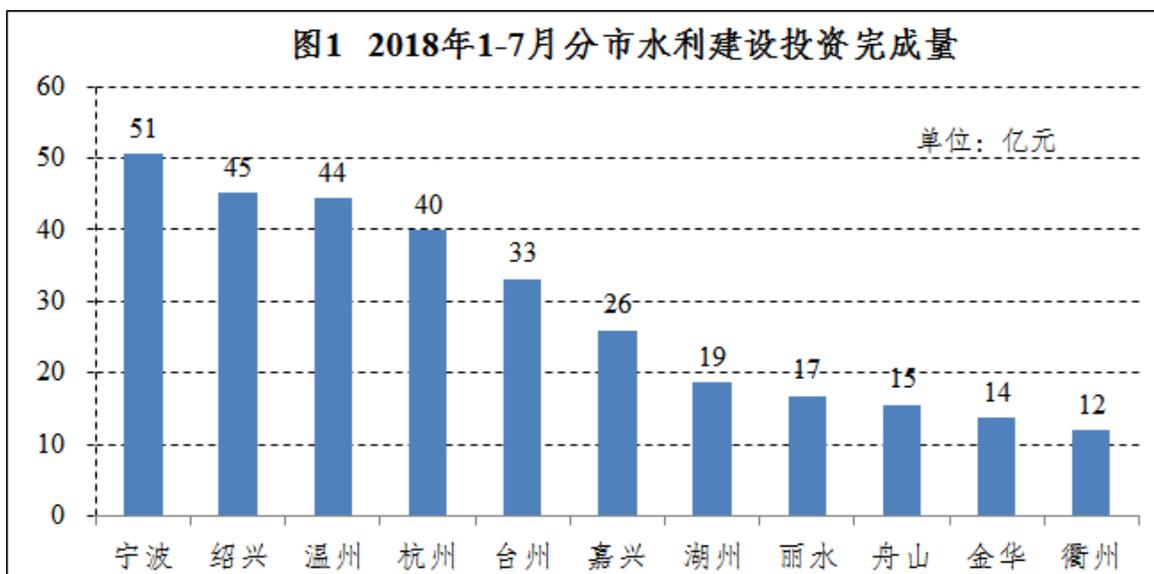


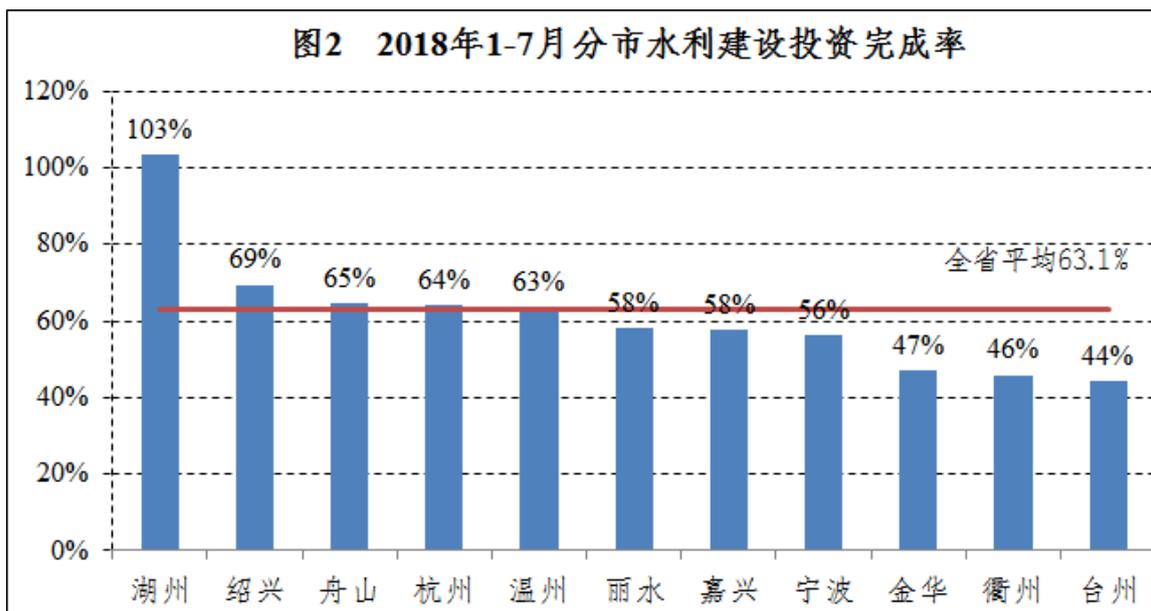

## 二、中央水利投资计划执行进展情况

**2018年进展情况：**至7月底，中央下达我省2018年投资计划37.7亿元，其中中央资金11.7亿元；完成投资25.6亿元，完成率68.0%，完成中央资金9.5亿元、完成率81.4%。

从分类看，大中型病险水库水闸加固、小型水库除险加固、水土流失治理完成率较高（90%以上）；山洪灾害、河长制奖励、水资源节约保护、水资源监控能力建设完成率较低（80%以下）。

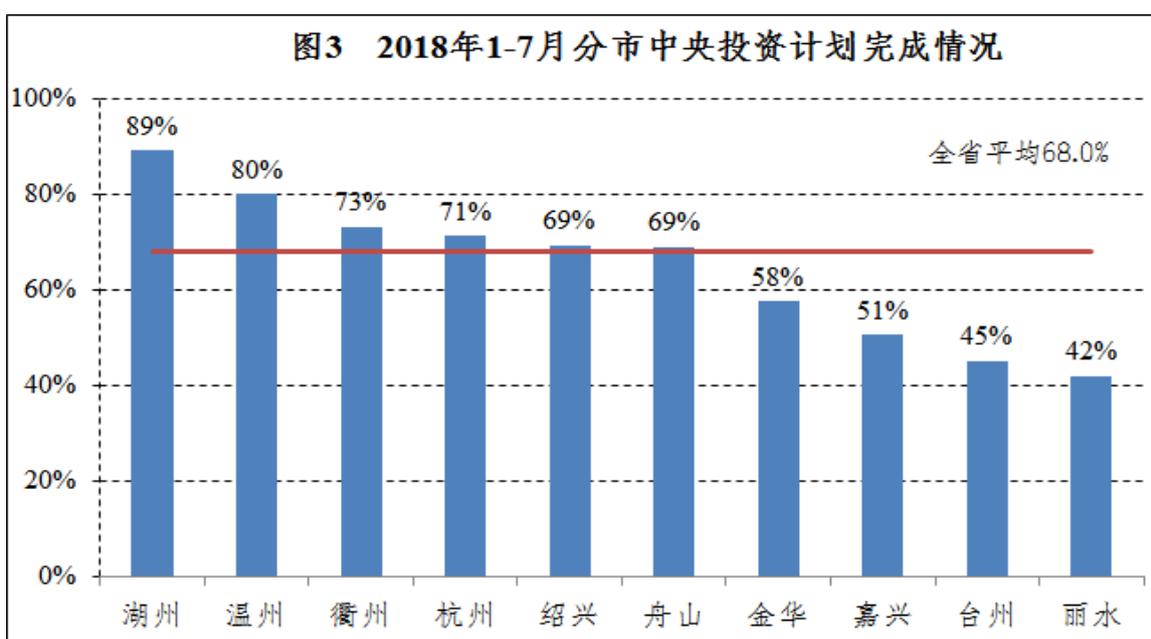

## 2018 年度中央项目分类型完成情况

单位：万元



序号	类型名称	计划下达		投资完成		完成率	
		年度计划	中央资金	计划完成	中央完成	年度计划	中央资金
<b>总计</b>		<b>377360</b>	<b>117198</b>	<b>256628</b>	<b>95361</b>	<b>68%</b>	<b>81%</b>
<b>一</b>	<b>中央预算内项目</b>	<b>50900</b>	<b>11900</b>	<b>45519</b>	<b>10500</b>	<b>89%</b>	<b>88%</b>
1	大中型病险水闸除险加固	2000	1200	1840	1200	92%	100%
2	大中型病险水库除险加固	6900	2300	5120	2300	74%	100%
3	独流入海河流治理	42000	8400	38559	7000	92%	83%
<b>二</b>	<b>中央财政资金</b>	<b>326460</b>	<b>105298</b>	<b>211109</b>	<b>84861</b>	<b>65%</b>	<b>81%</b>
4	小型病险水库除险加固	16587	2930	11685	2805	70%	96%
5	水土流失治理	7956	3250	4085	2955	51%	91%
6	中小河流治理及重点县	172167	42540	126255	36170	73%	85%
7	圩区标准化养护	4473	3077	2711	2552	61%	83%
8	农村基层防汛预报预警体系	4678	1053	2440	868	52%	82%
9	小型农田水利建设	99547	38755	52941	31871	53%	82%
10	山洪灾害防治	4496	2370	2595	1684	58%	71%
11	河长制奖励资金	7719	4000	4296	2613	56%	65%
12	水资源节约保护	8836	7323	4102	3344	46%	46%
13	水资源监控能力建设	1523	1323	199	179	13%	14%

### 三、百项千亿防洪排涝工程建设进展情况

1-7 月，全省百项千亿防洪排涝工程在建 67 项，完成水利投资 124.5 亿元，年度投资完成率 54.1%。宁波、绍兴分别完成投资 27.7 亿元、26.5 亿元，湖州、绍兴、杭州、宁波等 4 市完成年度投资计划 60% 以上，已达到时序进度要求。台州、衢州等 2 市年度投资完成率低于 40%，进度持续明显滞后。

加快推进前期 21 项，太嘉河后续可研已批复。可研已

批未开工 12 项，各地要抓紧做好各项开工准备工作，及早开工建设。

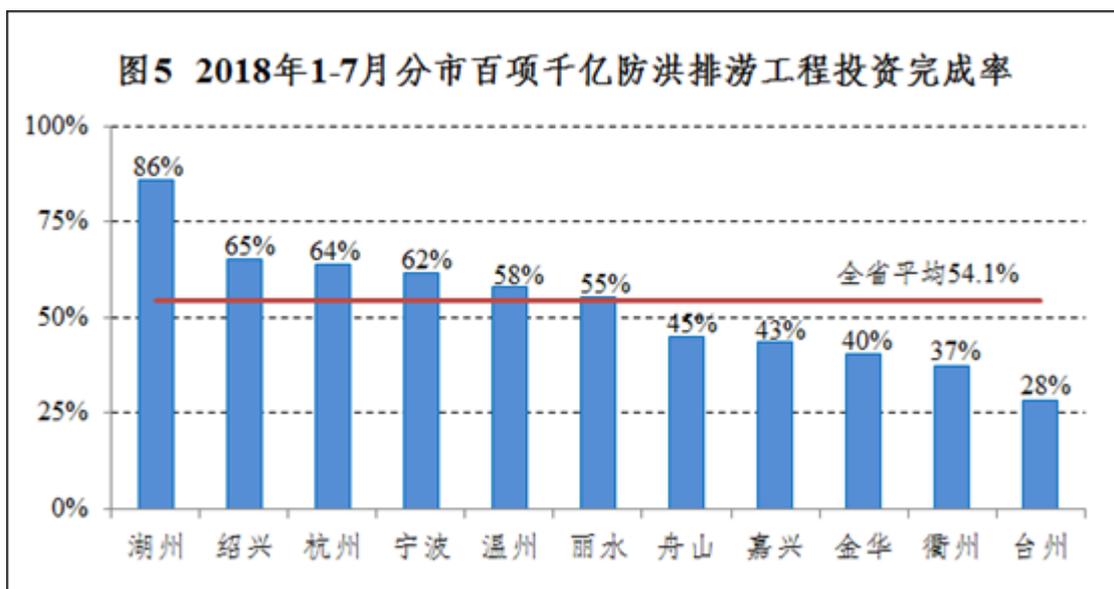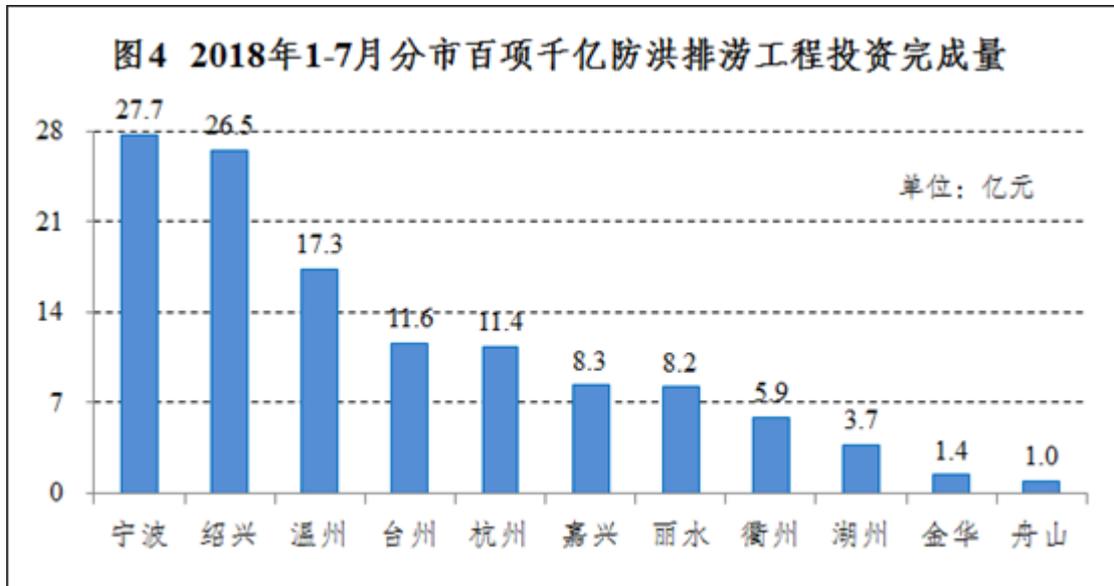

#### 四、面上建设任务指标完成情况

海塘干堤加固：全年计划完成 100 公里，已完工 61.6 公里、完成率 61.6%；其中海塘 6 公里、干堤 55.6 公里；

水库加固：全年计划完成 100 座，已完成 86 座、完成率 86.0%；

圩区整治：全年计划完成 30 万亩，已完成 18.8 万亩、完成率 62.7%；

山塘整治：全年计划完成 500 座，已完成 303 座、完成率 60.6%。

农村饮水安全提升：全年计划完成 100 万人，已完成 66.8 万人、完成率 66.8%。

高效节水面积：全年计划完成 25 万亩，已完成 19.2 万亩、完成率 64.4%。

小水电站生态治理：全年计划完成 19 座，已完成 9 座、完成率 76.9% ；

河道综合整治：全年计划完成 500 公里，已完成 412.3 公里，完成率 82.5%；河湖库塘清淤：全年计划完成 7000 万方，已完成 5824.8 万方、完成率 83.2%。

## 五、面上资金分解情况

2017 年 10 月提前下达 2018 年第一批面上省级资金，尚有 14 个县市区未完成分解。3 月下达的第二批面上资金，全省近一半县（市、区）未完成分解工作。各地要按照有关文件要求，商同级财政尽快分解下达面上任务和资金，并按要求抄送省水利厅、财政厅。

## 2018 年面上水利建设与管理任务省级资金分解情况

序号	地市	未完成第一批分解地区	未完成第二批分解地区
1	杭州	萧山区	市本级、萧山区
2	温州	文成县	瑞安市、苍南县、文成县
3	嘉兴	/	秀洲区、嘉善县、海盐县
4	绍兴	/	新昌市
5	金华	东阳市、永康市	东阳市、义乌市、永康市、武义县
6	舟山	/	定海区、嵊泗县
7	台州	市本级、天台县	市本级、黄岩区
8	衢州	/	江山市
9	丽水	/	市本级、龙泉市、云和县、松阳县

- 附件：1. 2018 年全省水利建设投资完成情况表
2. 2018 年全省百项千亿水利项目进展情况表（建设类）
3. 2018 年全省百项千亿水利项目进展情况表（前期类）

2018年全省水利建设投资完成情况表

序号	市、县(市、区)	年度投资计划及完成情况				中央投资计划及完成情况					
		年度目标	省级资金	1~7月完成投资	1~7月投资完成率	中央投资计划	中央资金	完成中央投资	完成中央资金	中央投资完成率	中央资金完成率
		亿元	亿元	亿元		万元	万元	万元	万元		
	<b>总计</b>	<b>500</b>	<b>81.03</b>	<b>315.46</b>	<b>63%</b>	<b>377360</b>	<b>117198</b>	<b>256628</b>	<b>95361</b>	<b>68%</b>	<b>81%</b>
一	<b>省本级</b>	/	/	/	/	1523	1323	199	179	13%	14%
1	省属	/	/	/	/	1523	1323	199	179	13%	14%
二	<b>杭州</b>	<b>62</b>	<b>9.07</b>	<b>39.95</b>	<b>64%</b>	<b>22851</b>	<b>7940</b>	<b>16295</b>	<b>7670</b>	<b>71%</b>	<b>97%</b>
2	杭州市本级	29	1.64	18.79	65%	/	/	/	/	/	/
3	萧山区	8	4.61	5.90	74%	/	/	/	/	/	/
4	余杭区	6	0.24	3.35	56%	220	220	70	70	32%	32%
5	富阳区	5.5	0.35	3.32	60%	1127	200	977	170	87%	85%
6	桐庐县	2.5	0.28	1.23	49%	880	190	704	190	80%	100%
7	建德市	3.8	0.61	2.12	56%	6116	1760	3498	1760	57%	100%
8	淳安县	2.2	0.76	2.30	105%	12278	3340	8816	3250	72%	97%
9	临安区	5	0.58	2.94	59%	2230	2230	2230	2230	100%	100%
三	<b>宁波</b>	<b>90</b>	/	<b>50.55</b>	<b>56%</b>	/	/	/	/	/	/
10	宁波市本级	54	/	29.11	54%	/	/	/	/	/	/
11	慈溪市	9	/	6.29	70%	/	/	/	/	/	/
12	余姚市	10	/	5.85	59%	/	/	/	/	/	/
13	宁海县	12	/	6.79	57%	/	/	/	/	/	/
14	象山县	5	/	2.50	50%	/	/	/	/	/	/
四	<b>温州</b>	<b>70</b>	<b>10.48</b>	<b>44.43</b>	<b>63%</b>	<b>69183</b>	<b>17970</b>	<b>55466</b>	<b>13955</b>	<b>80%</b>	<b>78%</b>
15	温州市本级	11.2	0.50	6.38	57%	/	/	/	/	/	/
16	鹿城区	9.3	1.04	6.78	73%	4000	800	2500	0	63%	0%
17	瓯海区	6.5	0.63	4.81	74%	3118	1050	2204	1050	71%	100%
18	龙湾区	2.6	0.23	1.54	59%	170	170	80	80	47%	47%
19	洞头区	0.8	0.03	0.61	76%	380	100	310	100	82%	100%
20	乐清市	6.5	0.10	3.97	61%	3953	990	2937.6	414.64	74%	42%
21	瑞安市	5.5	0.87	3.11	57%	/	/	/	/	/	/
22	永嘉县	7.2	1.21	4.28	59%	/	/	/	/	/	/
23	平阳县	10.2	3.73	6.30	62%	22045	5550	21337	3890	97%	70%
24	苍南县	6.3	1.06	3.70	59%	12300	3560	11610	3360	94%	94%
25	文成县	1.7	0.32	1.17	69%	18000	3700	13087	3700	73%	100%
26	泰顺县	2.2	0.75	1.80	82%	5216.6	2050	1400	1360	27%	66%
五	<b>嘉兴</b>	<b>45</b>	<b>5.84</b>	<b>25.90</b>	<b>58%</b>	<b>42466</b>	<b>14363</b>	<b>21498</b>	<b>12419</b>	<b>51%</b>	<b>86%</b>

序号	市、县(市、区)	年度投资计划及完成情况				中央投资计划及完成情况					
		年度目标	省级资金	1~7月完成投资	1~7月投资完成率	中央投资计划	中央资金	完成中央投资	完成中央资金	中央投资完成率	中央资金完成率
		亿元	亿元	亿元		万元	万元	万元	万元		
27	嘉兴市本级	23.9	0.59	11.01	46%	/	/	/	/	/	/
28	南湖区	1.4	0.13	0.59	42%	4963.2	1590	1350	1350	27%	85%
29	秀洲区	6	2.24	3.31	55%	4482	2040	2668	1950	60%	96%
30	海宁市	2.6	0.32	1.89	73%	5865	1890	3859.8	1720.8	66%	91%
31	平湖市	2.1	0.57	1.12	53%	2750	690	2560	560	93%	81%
32	桐乡市	1.5	0.25	1.20	80%	11586	4080	6130	3655	53%	90%
33	嘉善县	3.3	0.96	1.99	60%	9999	2550	2420	1970	24%	77%
34	海盐县	4.2	0.79	4.78	114%	2820	1523	2510	1213	89%	80%
<b>六</b>	<b>湖州</b>	<b>18</b>	<b>5.87</b>	<b>18.63</b>	<b>103%</b>	<b>70453</b>	<b>17422</b>	<b>62982</b>	<b>16880</b>	<b>89%</b>	<b>97%</b>
35	湖州市本级	2.3	1.11	1.90	82%	/	/	/	/	/	/
36	吴兴区	1.5	0.21	1.56	104%	3200	1070	2052	780	64%	73%
37	南浔区	1.8	0.80	2.89	160%	13545	3782	11362	3782	84%	100%
38	德清县	5	2.34	4.68	94%	28719	6130	27243	5958	95%	97%
39	安吉县	2	0.69	1.68	84%	5648.8	2620	4844.9	2620	86%	100%
40	长兴县	5.4	0.72	5.92	110%	19340	3820	17480	3740	90%	98%
<b>七</b>	<b>绍兴</b>	<b>65</b>	<b>9.71</b>	<b>45.08</b>	<b>69%</b>	<b>15918</b>	<b>5070</b>	<b>11062</b>	<b>4776</b>	<b>69%</b>	<b>94%</b>
41	绍兴市本级	7.5	4.08	3.16	42%	/	/	/	/	/	/
42	越城区	17.5	0.00	10.58	60%	480	120	160	60	33%	50%
43	柯桥区	9.5	2.11	7.82	82%	650	480	650	480	100%	100%
44	上虞区	9	0.85	7.31	81%	190	100	66	66	35%	66%
45	诸暨市	10.5	1.44	7.22	69%	8848	2200	7582	2160	86%	98%
46	嵊州市	7.5	0.75	4.78	64%	680.48	270	534	170	78%	63%
47	新昌县	3.5	0.48	4.21	120%	5070	1900	2070	1840	41%	97%
<b>八</b>	<b>金华</b>	<b>29</b>	<b>5.39</b>	<b>13.62</b>	<b>47%</b>	<b>26700</b>	<b>10970</b>	<b>15425</b>	<b>6735</b>	<b>58%</b>	<b>61%</b>
48	金华市本级	3.2	0.84	1.05	33%	/	/	/	/	/	/
49	婺城区	3.5	0.17	0.67	19%	7104	970	6055	970	85%	100%
50	金东区	3.1	0.29	1.00	32%	1610	1610	50	50	3%	3%
51	兰溪市	5.2	2.46	2.41	46%	640.82	100	640.82	100	100%	100%
52	东阳市	2.6	0.42	1.31	50%	3281	1940	3281	1940	100%	100%
53	义乌市	5.2	0.23	3.40	65%	818	390	721	293	88%	75%
54	永康市	2.6	0.27	2.02	78%	5319	2670	3310	2260	62%	85%
55	浦江县	1.2	0.25	0.94	79%	1620	1280	1162	972	72%	76%
56	武义县	1.2	0.28	0.33	27%	4881.8	1410	155	150	3%	11%
57	磐安县	1.2	0.18	0.50	42%	1425	600	50	0	4%	0%
<b>九</b>	<b>舟山</b>	<b>24</b>	<b>4.87</b>	<b>15.50</b>	<b>65%</b>	<b>37378</b>	<b>8430</b>	<b>25837</b>	<b>7131.8</b>	<b>69%</b>	<b>85%</b>

序号	市、县(市、区)	年度投资计划及完成情况				中央投资计划及完成情况					
		年度目标	省级资金	1~7月完成投资	1~7月投资完成率	中央投资计划	中央资金	完成中央投资	完成中央资金	中央投资完成率	中央资金完成率
		亿元	亿元	亿元		万元	万元	万元	万元		
58	舟山市本级	5.4	1.54	3.56	66%	538.38	80	31.78	31.78	0.059	0.3973
59	定海区	2.8	1.69	2.07	74%	17949	3470	16621	3210	93%	93%
60	普陀区	4.2	0.87	2.87	68%	15290	2940	7289	2450	48%	83%
61	岱山县	11.2	0.59	6.73	60%	3300	1640	1795	1340	54%	82%
62	嵊泗县	0.4	0.17	0.27	67%	300	300	100	100	33%	33%
<b>十</b>	<b>台州</b>	<b>75</b>	<b>11.80</b>	<b>33.09</b>	<b>44%</b>	<b>12604</b>	<b>5510</b>	<b>5707.6</b>	<b>3822.6</b>	<b>45%</b>	<b>69%</b>
63	台州市本级	32.6	3.97	14.28	44%	/	/	/	/	/	/
64	椒江区	3.8	0.10	2.53	67%	220	220	73	73	33%	33%
65	黄岩区	5.3	1.63	0.70	13%	650	350	280	280	43%	80%
66	路桥区	4.6	1.62	2.01	44%	220	220	80	80	36%	36%
67	温岭市	4.6	1.05	2.79	61%	750	440	643.05	173.05	86%	39%
68	临海市	8.5	1.18	3.24	38%	60	60	60	60	100%	100%
69	三门县	3	0.63	0.46	15%	5980	1290	913	503	15%	39%
70	天台县	6.2	0.57	3.14	51%	80	80	80	80	100%	100%
71	仙居县	4.2	0.97	2.29	55%	4254	2460	3360	2355	79%	96%
72	玉环市	2.2	0.08	1.63	74%	390	390	218.5	218.5	56%	56%
<b>十一</b>	<b>衢州</b>	<b>26</b>	<b>10.89</b>	<b>11.93</b>	<b>46%</b>	<b>29651</b>	<b>8670</b>	<b>21722</b>	<b>7618</b>	<b>73%</b>	<b>88%</b>
73	衢州市本级	2	0.55	0.45	23%	/	/	/	/	/	/
74	柯城区	3	1.17	0.97	32%	572	300	492	220	86%	73%
75	衢江区	3.3	0.89	2.02	61%	4045.8	1590	3323	1590	82%	100%
76	江山市	5.7	2.96	2.82	49%	2983	1530	1098	1058	37%	69%
77	龙游县	5	1.56	2.06	41%	7670	2070	3170	1570	41%	76%
78	常山县	4	1.87	1.74	44%	3054	1420	1770	1420	58%	100%
79	开化县	3	1.89	1.86	62%	11327	1760	11869	1760	105%	100%
<b>十二</b>	<b>丽水</b>	<b>29</b>	<b>7.12</b>	<b>16.80</b>	<b>58%</b>	<b>48633</b>	<b>19530</b>	<b>20435</b>	<b>14175</b>	<b>42%</b>	<b>73%</b>
80	丽水市本级	6.3	0.23	2.11	33%	/	/	/	/	/	/
81	莲都区	2.8	0.40	0.76	27%	3845	1780	1350	1350	35%	76%
82	龙泉市	2	1.11	1.57	79%	8499	2870	5509	2870	65%	100%
83	青田县	4	0.34	2.45	61%	11750	840	1000	840	9%	100%
84	云和县	1	0.27	0.57	57%	7955.8	2690	3150	1450	40%	54%
85	庆元县	2.7	0.85	1.29	48%	2500	2500	1095	1095	44%	44%
86	缙云县	3.2	1.47	2.88	90%	2840	2840	2250	1950	79%	69%
87	遂昌县	2	0.99	1.66	83%	9003	3830	4756	3325	53%	87%
88	松阳县	4	1.14	2.81	70%	2030	2030	1200	1200	59%	59%
89	景宁县	1	0.33	0.70	70%	210	150	125	95	60%	63%

## 2018年“百项千亿”水利项目进展情况表（建设类）

单位：万元

序号	县市区	项目名称	总投资	截至2017 年底累计 完成投资	2018年计划		
					年度 目标	1-7月完 成投资	年度目标 完成率
合计			16146000	4509851	2363100	1245070	54.1%
1	杭州、嘉 兴、湖州	扩大杭嘉湖南排工程	664000	516097	88000	42885	49%
(1)	杭州市 本级	扩大杭嘉湖南排八堡排水泵站 工程	129000	/	10000	6000	60%
(2)	嘉兴市 本级	扩大杭嘉湖南排工程（嘉兴部 分）	454300	310431	70000	31235	45%
(3)	德清县	扩大杭嘉湖南排工程（德清部 分）	100805	92636	8000	5650	71%
2	湖州	苕溪清水入湖河道整治工程	740000	432958	30000	23269	78%
(1)	长兴县	苕溪清水入湖河道整治工程 （长兴段）	289418	263430	25000	18680	75%
(2)	安吉县	苕溪清水入湖河道整治工程 （安吉段）	185600	169528	5000	4589	92%
3	湖州市 本级	苕溪清水入湖河道整治后续工 程	218000	30000	5000	7900	158%
4	柯桥区	柯桥区瓜渚湖直江柯北段拓浚 工程	116000	33000	70000	72000	103%
5	杭州市 本级	杭州市大江东钱塘江标准塘工 程	102000	78371	25300	21100	83%
6	鹿城区	鹿城区戍浦江河道（藤桥至河 口段）整治工程	91000	76530	29000	24000	83%
7	萧山区	萧山区浦阳江治理工程	425000	197932	56000	42247	75%
8	台州市 本级	台州市东官河综合整治工程	233000	139521	50000	37310	75%
9	嵊州市	嵊州市湛头滞洪区改造工程	129000	90000	28800	21045	73%
10	缙云县	好溪水利枢纽潜明水库一期工 程	161000	107800	27000	19200	71%
11	慈溪市	宁波市姚江二通道（慈江）工 程	248000	/	70000	49712	71%
12	青田县	青田县青田水利枢纽工程	160000	101900	20000	14200	71%
13	越城区	绍兴市三江闸排涝配套河道 拓浚工程（越城片）	262000	129284	70000	48200	69%
14	鹿城区	鹿城区瓯江绕城高速至卧旗山 段海塘加固工程	188000	108640	50000	34238	68%
15	余姚市	余姚市姚江城区段堤防加固工 程	86000	/	20000	13500	68%
16	松阳县	松阳县黄南水库工程	181000	104442	38000	25300	67%

序号	县市区	项目名称	总投资	截至2017 年底累计 完成投资	2018年计划		
					年度 目标	1-7月完 成投资	年度目标 完成率
17	上虞区	上虞区虞北平原滨江河-沥北河 整治工程	95000	89030	8000	5325	67%
18	仙居县	仙居县孟溪水库工程	27000	34650	1000	650	65%
19	慈溪市	慈溪市北排工程	612000	/	70000	45485	65%
20	瑞安市	瑞安市飞云江治理一期工程	96000	101308	12000	7688	64%
21	富阳区	杭州市富阳区富春江治理工程	289000	152944	25000	16000	64%
22	上虞区	上虞区虞东河湖综合整治工程	120000	53500	27500	17565	64%
23	苍南县	苍南县江南垟平原骨干排涝工 程	242000	34890	20000	12370	62%
24	平湖市	嘉兴市平湖塘延伸拓浚工程	357000	320135	25000	15390	62%
25	龙游县	龙游县高坪桥水库工程	99000	61000	23000	14100	61%
26	文成县	文成县飞云江治理二期工程	27000	19000	8300	5057	61%
27	奉化市	宁波市葛岙水库工程	442000	/	80000	48700	61%
28	平阳县	鳌江干流治理平阳县水头段防 洪工程	167000	47005	44000	26723	61%
29	浙东局	姚江上游西排工程	123000	37842	25000	15128	61%
30	临海市	临海市方溪水库工程	115000	91634	15000	9049	60%
31	永嘉县	温州市乌牛溪（永乐河）治理 工程	72000	28223	23000	13815	60%
32	宁波市 本级	宁波市鄞奉平原排涝工程	715000	/	140000	83877	60%
33	临海市	临海市大田平原排涝一期工程	133000	96614	20000	11910	60%
34	龙泉市	龙泉市龙泉溪治理二期工程	27000	15661	9500	5600	59%
35	余姚市	余姚市扩大北排工程	450000	/	40000	23500	59%
36	萧山区	杭州市萧山区蜀山片外排工程	172000	5000	11000	6434	58%
37	杭州市 本级	杭州市大江东片外排工程	121000	32900	30000	17500	58%
38	鹿城区 瓯海区	温州市温瑞平原西片排涝工程	246000	64525	60000	34034	57%
39	兰溪市	兰溪市钱塘江堤防加固工程	136000	65000	25000	14150	57%
40	越城区	绍兴市马山闸强排及配套河道 建设工程	233000	/	100000	55000	55%

序号	县市区	项目名称	总投资	截至2017 年底累计 完成投资	2018年计划		
					年度 目标	1-7月完 成投资	年度目标 完成率
41	绍兴市 本级	绍兴市袍江片东入曹娥江排涝工程	256000	112000	20000	10900	55%
42	海盐县	海盐县东段围涂标准海塘工程	34000	6084	25000	13598	54%
43	诸暨市	诸暨市浦阳江治理二期工程	74000	12000	35000	18900	54%
44	江山市	江山市江山港综合治理工程	224000	33008	40000	21368	53%
45	龙湾区 经开区	温州市温瑞平原东片排涝工程	355000	74793	17000	9030	53%
46	丽水市 本级	丽水市大溪治理工程	77000	63808	2000	1000	50%
47	嘉兴市 本级	嘉兴市南排闸站除险加固工程	33000	10081	5300	2486	47%
48	舟山市 本级	舟山群岛新区定海强排工程	72000	14166	21400	9565	45%
49	台州市 本级	台州市朱溪水库工程	374000	113800	90000	40198	45%
50	建德市	建德市新安江、兰江治理工程	17000	12818	10000	4339	43%
51	余姚市	余姚市姚江上游西分工程	195000	/	30000	12500	42%
52	遂昌县	遂昌县清水源水库工程	58000	6000	15000	6000	40%
53	庆元县	庆元县兰溪桥水库扩建工程	150000	/	15000	6000	40%
54	诸暨市	诸暨市高湖蓄滞洪区改造工程	220000	160500	40000	15946	40%
55	乐清市	乐清市乐柳虹平原排涝工程	170000	5050	3000	1150	38%
56	秀洲区 嘉善县	嘉兴市北部湖荡整治及河湖连通工程	250000	15739	57000	20000	35%
57	常山县	常山县常山港治理二期工程	88000	10158	30000	9410	31%
58	丽水市 本级	丽水市大溪治理提升改造工程	100000	2000	17000	4650	27%
59	柯城区	衢州市柯城区常山港治理工程	100000	1700	20000	5000	25%
60	平阳县	平阳县瑞平平原排涝工程	140000	/	10000	2500	25%
61	衢州市 本级	衢州市本级衢江治理二期工程	142000	54300	25000	6180	25%
62	三门县	三门县东屏水库工程	70000	24664	15000	3371	22%
63	温岭市	温岭市南排工程	364000	25200	30000	5290	18%
64	永嘉县	永嘉县瓯北三江标准堤工程	173000	100821	15000	2255	15%

序号	县市区	项目名称	总投资	截至2017 年底累计 完成投资	2018年计划		
					年度 目标	1-7月完 成投资	年度目标 完成率
65	龙游县	龙游县衢江治理二期工程	54000	20800	20000	3000	15%
66	桐庐县	桐庐县富春江干堤加固二期工程	51000	24789	1500	200	13%
67	椒江区	台州市洪家场浦强排工程	217000	26300	50000	5000	10%
68	平湖市	平湖市白沙湾至水口标准海塘加固工程	35000	/	10000	700	7%
69	路桥区	台州市路桥区青龙浦排涝工程	210000	50578	45000	2178	5%
70	黄岩区	台州市黄岩区北排工程	315000	13650	30000	1000	3%
71	台州市 本级	台州市永宁江闸强排工程	115000	2850	20000	200	1%
72	台州市 本级	台州市七条河拓浚工程	156000	3400	20000	0	0%
73	临海市	临海市大田平原排涝二期工程	270000	/	5000	可研已批，未开工	
74	上虞区	绍兴市上虞区崧北河综合治理工程	66000	/	3000	可研已批，未开工	
75	临安区	临安区双溪口水库工程	51000	1160	5000	可研已批，未开工	
76	桐庐县	桐庐县富春江干堤加固三期工程	24000	1000	4500	可研已批，未开工	
77	金华市 本级	金华市本级金华江治理二期工程	93000	9300	10000	可研已批，未开工	
78	临海市	临海市东部平原排涝工程	179000	/	5000	一期可研已批，未开工	
79	河道总站 钱管局	海宁市秧田庙至塔山坝段海塘工程	20000	/	新开工	初设已审	
80	瑞安市	瑞安市温瑞平原南部排涝工程	200000	/	2000	可研已审	
81	苍南县 平阳县	温州市江西垟平原排涝工程	187000	/	5000	一、二期可研已审	
82	台州市 本级	台州市灵江扩排挡潮工程	1047000	/	15000	可研在编	
83	青田县	青田县瓯江治理二期工程	21000	/	5000	可研已审，滞后	
84	鹿城区	温州市鹿城区瓯江治理二期工程	90000	/	新开工	可研已审，滞后	
85	绍兴市 本级	绍兴市曹娥江综合整治工程	200000	/	5000	可研已审，滞后	

注：年度完成率低于全省平均的为滞后项目，其中红色为严重滞后，黄色为一般滞后。

2018年“百项千亿”水利项目进展情况表（前期类）

序号	县（市、区）	项目名称	年度目标	当月计划目标	1-7月完成情况	进展情况
1	湖州市本级	太嘉河及杭嘉湖环湖河道整治后续工程	力争完成可研批复	完成规划选址及土地预审等专题批复	可研已批	正常
2	湖州市本级	环湖大堤（浙江段）后续工程	按照国家要求开展，力争完成可研批复	按照国家要求开展	可研已复审，移民安置规划报告已报部	正常
3	嘉善县	嘉兴市中心河拓浚及河湖连通工程	完成可研批复	完成规划选址批复	可研已审；规划选址已批	正常
4	嘉兴市本级	太浦河后续工程（浙江段）	按照国家要求开展	按照国家要求开展	可研在编	正常
5	开化县	开化县开化水库工程	按照国家要求开展，力争完成可研批复	按照国家要求开展	可研已复审，移民大纲已审	正常
6	龙湾区	温州市龙湾区瓯江标准海塘提升改造工程	完成可研批复	完成可研审查	可研已审	正常
7	宁海县 天台县 三门县	清溪水库工程	加快推进可研工作	开展可研编制	可研在编	正常
8	磐安县	磐安县流岸水库工程	完成可研批复	完成规划选址	可研已审；规划选址已批	正常
9	温岭市	温岭九龙汇调蓄工程	完成可研审查，力争完成可研批复	开展可研编制	可研在编	正常
10	义乌市	双江水利枢纽工程	完成可研批复	完成规划选址批复	可研已审；规划选址已批	正常
11	永嘉县	永嘉县南岸水库	按照国家要求开展	按照国家要求开展	可研已编	正常
12	临海市	台州市椒江治理工程（汛桥段）	完成可研批复	完成规划选址上报、土地预审组件编制	可研已审	滞后
13	磐安县 永康市	磐安县虬里水库工程	加快推进可研工作	开展可研编制	可研在编	滞后
14	瑞安市	瑞安市飞云江治理二期工程	完成可研批复	完成可研审查	可研已审	滞后
15	台州市本级	台州市金清港强排工程	加快推进可研工作	开展可研编制	可研在编	滞后
