

全省水利统计简报


(1-8月)


厅规划计划处

2018年9月10日

一、全省水利建设投资完成情况

2018年全省水利建设计划完成投资500亿元。至8月底，全省水利建设完成投资371.4亿元，完成率74.3%。

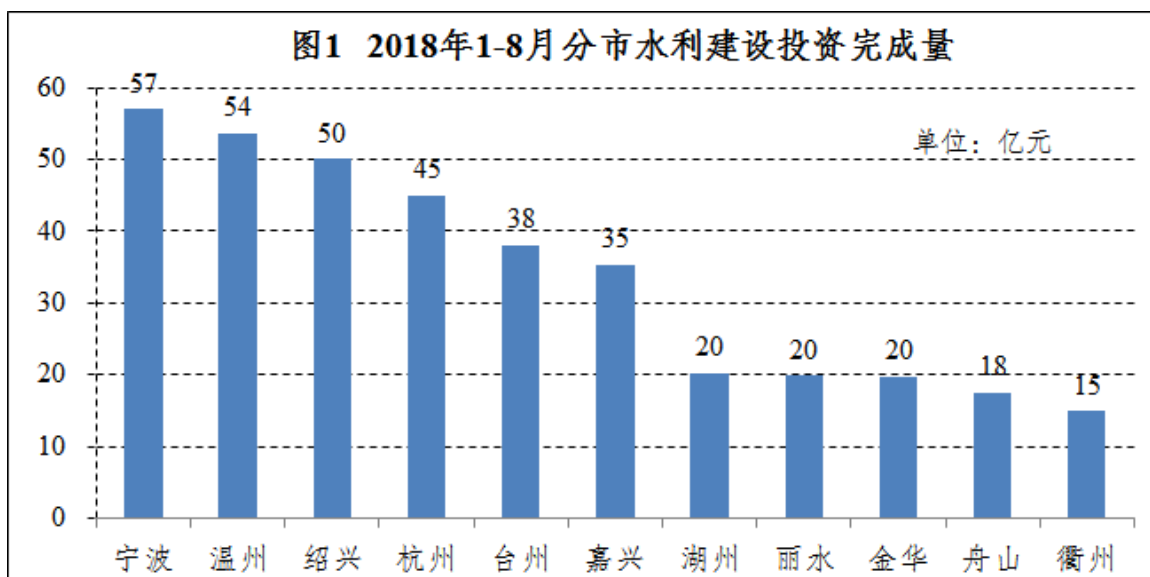


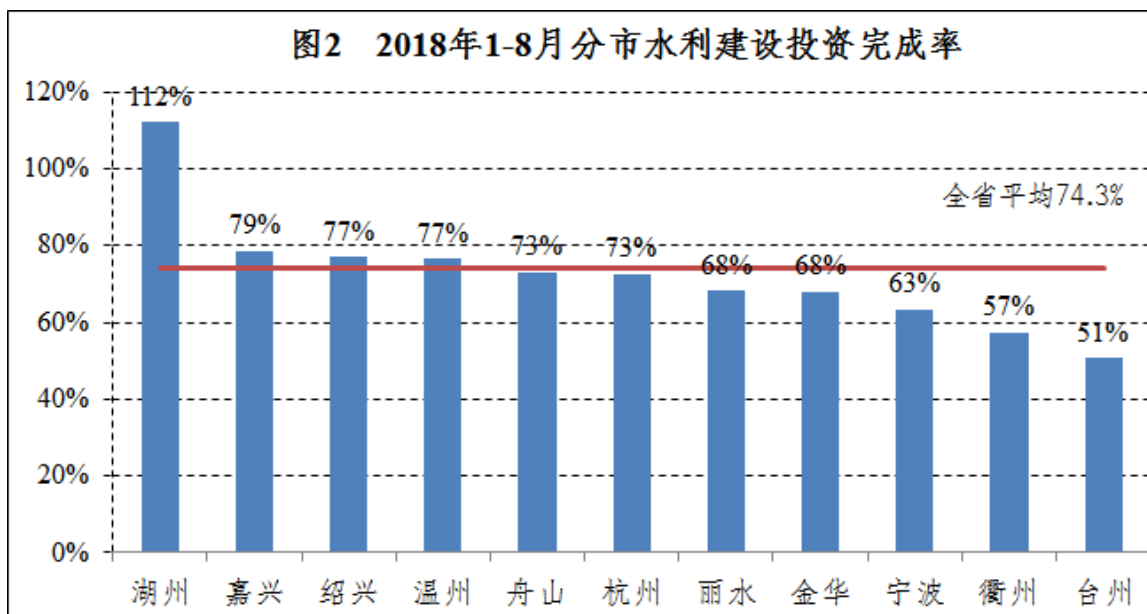

二、中央水利投资计划执行进展情况

2018年进展情况：至8月底，中央下达我省2018年投资计划44.5亿元，其中中央资金13.6亿元；完成投资31.2亿元，完成率72.3%，完成中央资金12.0亿元、完成率88.1%。

从分类看，大中型病险水库水闸加固、独流入海河流治理年度计划完成率较高（80%以上）；水资源节约保护、水电增效扩容、农业水价改革、水资源监控能力建设完成率较低（60%以下）。

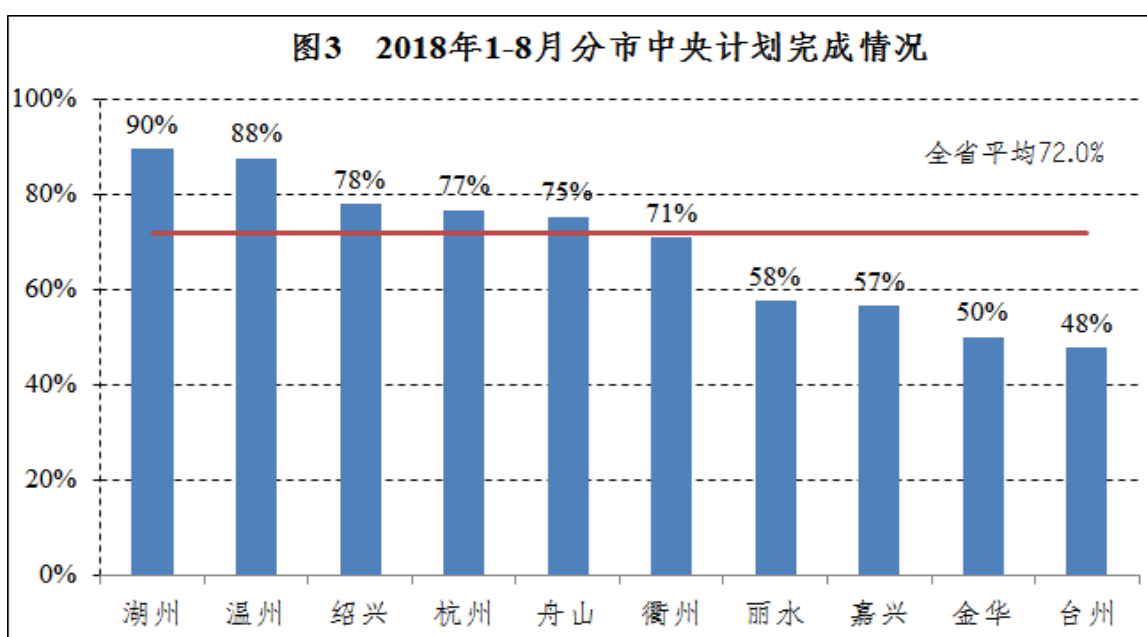

2018 年度中央项目分类型完成情况

单位：万元



序号	类型名称	计划下达		投资完成		完成率	
		年度计划	中央资金	计划完成	中央完成	年度计划	中央资金
总计		444551	136451	321593	120202	72%	88%
一、	中央预算内项目	50900	11900	47814	10500	94%	88%
1	大中型病险水闸除险加固	2000	1200	2000	1200	100%	100%
2	独流入海河流治理	42000	8400	39959	7000	95%	83%
3	大中型病险水库除险加固	6900	2300	5855	2300	85%	100%
二、	中央财政资金	393651	124551	273779	109702	70%	88%
1	中小河流治理	183881	42540	140380	40075	76%	94%
2	圩区标准化养护	4473	3077	3365	2957	75%	96%
3	小型病险水库除险加固	16587	2930	12331	2845	74%	97%
4	山洪灾害防治	4515	2370	3082	1943	68%	82%
5	江河湖库水系连通	39172	10065	25702	10065	66%	100%
6	小型农田水利建设	99547	38755	64773	36610	65%	94%
7	河长制奖励资金	8204	4000	5296	3275	65%	82%
8	基层防汛预报预警体系	4678	1053	2970	1023	63%	97%
9	水土流失治理	7956	3250	4897	3160	62%	97%
10	最严格水资源考核奖励资金	7353	6000	4350	3517	59%	59%
11	水电增效扩容	10950	6423	5511	3370	50%	52%
12	农业水价改革	4812	2765	923	684	19%	25%
13	水资源监控能力建设	1523	1323	199	179	13%	14%

三、百项千亿防洪排涝工程建设进展情况

1-8 月，全省百项千亿防洪排涝工程在建 68 项，完成水利投资 145.9 亿元，年度投资完成率 63.4%。宁波、绍兴、温州分别完成投资 31.3 亿元、28.7 亿元、21.2 亿元，湖州、杭州、温州、绍兴、宁波等 5 市完成年度投资计划 70% 以上，已达到时序进度要求。台州、衢州等 2 市年度投资完成率低

于 50%，进度持续明显滞后。8 月，平湖市白沙湾至水口标准海塘工程新开工建设。

加快推进前期 21 项。可研已批未开工 11 项，各地要抓紧做好各项开工准备工作，及早开工建设。

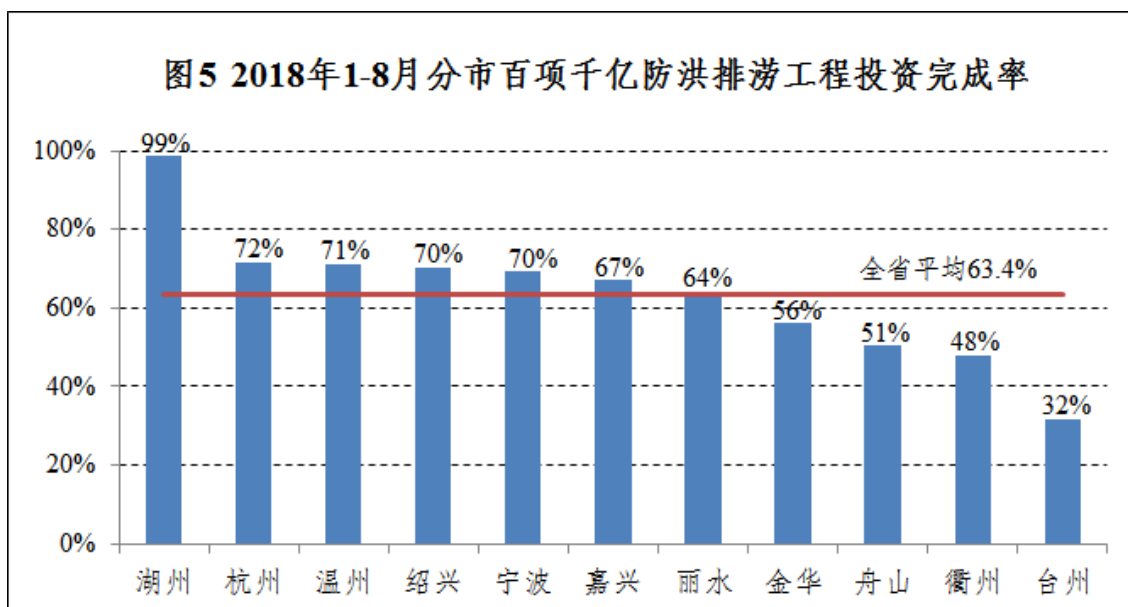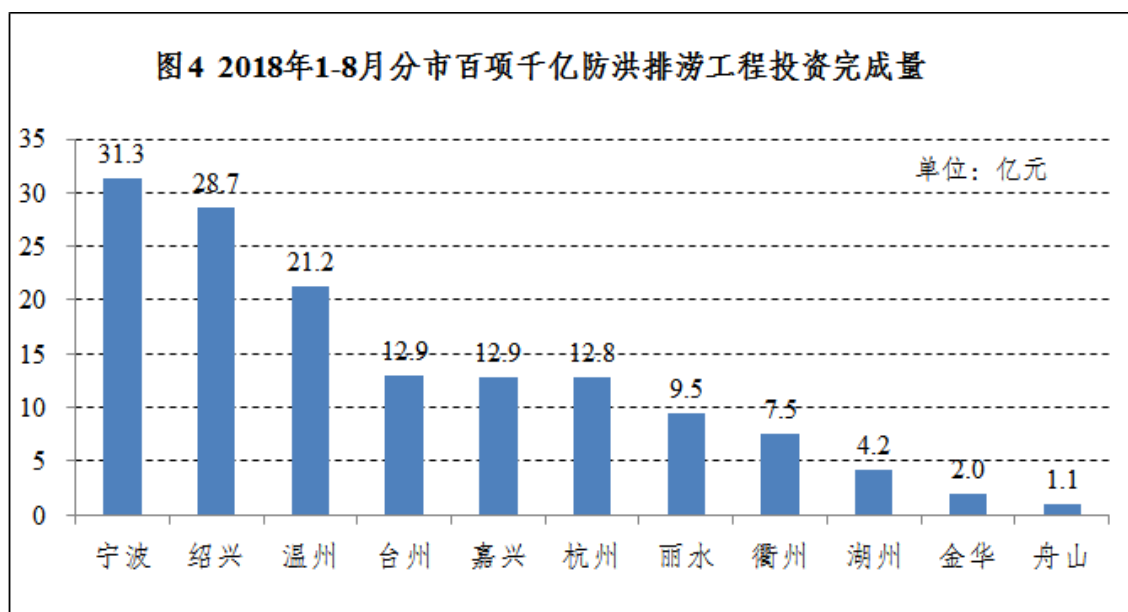

四、面上建设任务指标完成情况

海塘干堤加固：全年计划完成 100 公里，已完工 65.0 公里、完成率 65.0%；其中海塘 6.2 公里、干堤 58.8 公里；

水库加固：全年计划完成 100 座，已完成 89 座、完成率 89.0%；

圩区整治：全年计划完成 30 万亩，已完成 18.8 万亩、完成率 62.7%；

山塘整治：全年计划完成 500 座，已完成 354 座、完成率 70.8%。

农村饮水安全提升：全年计划完成 100 万人，已完成 66.8 万人、完成率 66.8%。

高效节水面积：全年计划完成 25 万亩，已完成 22.0 万亩、完成率 88.1%。

小水电站生态治理：全年计划完成 19 座，已完成 10 座、完成率 52.6% ；

河道综合整治：全年计划完成 500 公里，已完成 480.3 公里，完成率 96.1%；河湖库塘清淤：全年计划完成 7000 万方，已完成 6603.0 万方、完成率 94.3%。

五、面上资金分解情况

2017 年 10 月提前下达 2018 年第一批面上省级资金，尚有 5 个县市区未完成分解。3 月下达的第二批面上资金，有 15 个县市区未完成分解工作。各地要按照有关文件要求，商同级财政尽快分解下达面上任务和资金，并按要求抄送省水利厅、财政厅。

2018 年面上水利建设与管理任务省级资金分解情况

序号	地市	未完成第一批分解地区	未完成第二批分解地区
1	杭州	萧山区	市本级、萧山区
2	温州	文成县	瑞安市、苍南县、文成县
3	嘉兴	/	嘉善县
4	绍兴	/	新昌市
5	金华	东阳市、永康市	东阳市、义乌市、永康市、武义县
6	舟山	/	定海区
7	台州	天台县	市本级
8	衢州	/	江山市
9	丽水	/	云和县

- 附件：1.全省水利建设投资完成情况表
- 2.全省百项千亿水利项目进展情况表（建设类）
- 3.全省百项千亿水利项目进展情况表（前期类）

2018年全省水利建设投资完成情况表

序号	市、县(市、区)	年度投资计划及完成情况				中央投资计划及完成情况					
		年度目标	省级资金	1~8月完成投资	1~8月投资完成率	年度计划	中央资金	完成年度计划	完成中央资金	年度计划完成率	中央资金完成率
		亿元	亿元	亿元		万元	万元	万元	万元		
	总计	500	81.03	371.39	74%	444551	136451	321593	120202	72%	88%
一	省本级	/	/	/	/	1523	1323	199	179	13%	14%
1	省属	/	/	/	/	1523	1323	199	179	13%	14%
二	杭州	62	9.07	45.02	73%	23566	8655	18120	7832	77%	90%
2	杭州市本级	29	1.64	21.01	72%	/	/	/	/	/	/
3	萧山区	8	4.61	6.28	79%	/	/	/	/	/	/
4	余杭区	6	0.24	3.97	66%	220	220	80	80	36%	36%
5	富阳区	5.5	0.35	3.76	68%	1127	200	977	170	87%	85%
6	桐庐县	2.5	0.28	1.43	57%	910	220	778	220	85%	100%
7	建德市	3.8	0.61	2.54	67%	6246	1890	4322	1782	69%	94%
8	淳安县	2.2	0.76	2.79	127%	12698	3760	9723	3340	77%	89%
9	临安区	5	0.58	3.23	65%	2365	2365	2240	2240	95%	95%
三	宁波	90	0.00	57.04	63%	/	/	/	/	/	/
10	宁波市本级	54	0.00	33.24	62%	/	/	/	/	/	/
11	慈溪市	9	0.00	6.90	77%	/	/	/	/	/	/
12	余姚市	10	0.00	6.83	68%	/	/	/	/	/	/
13	宁海县	12	0.00	7.37	61%	/	/	/	/	/	/
14	象山县	5	0.00	2.70	54%	/	/	/	/	/	/
四	温州	70	10.48	53.68	77%	72415	20255	63554	18455	88%	91%
15	温州市本级	11.2	0.50	7.56	68%	/	/	/	/	/	/
16	鹿城区	9.3	1.04	7.54	81%	4000	800	2800	0	70%	0%
17	瓯海区	6.5	0.63	4.66	72%	3118	1050	2444	1050	78%	100%
18	龙湾区	2.6	0.23	1.94	75%	170	170	95	95	56%	56%
19	洞头区	0.8	0.03	0.72	90%	380	100	380	100	100%	100%
20	乐清市	6.5	0.10	5.77	89%	3953	990	3481	750	88%	76%
21	瑞安市	5.5	0.87	3.61	66%	115	115	50	50	43%	43%
22	永嘉县	7.2	1.21	6.64	92%	510	510	300	300	59%	59%
23	平阳县	10.2	3.73	7.42	73%	22265	5770	22877	5740	103%	99%
24	苍南县	6.3	1.06	4.32	69%	12510	3620	12180	3620	97%	100%
25	文成县	1.7	0.32	1.52	90%	19747	4650	16407	4650	83%	100%
26	泰顺县	2.2	0.75	1.97	90%	5647	2480	2540	2100	45%	85%
五	嘉兴	45	5.84	35.38	79%	43712	14850	24762	13856	57%	93%

序号	市、县(市、区)	年度投资计划及完成情况				中央投资计划及完成情况					
		年度目标	省级资金	1~8月完成投资	1~8月投资完成率	年度计划	中央资金	完成年度计划	完成中央资金	年度计划完成率	中央资金完成率
		亿元	亿元	亿元		万元	万元	万元	万元		
27	嘉兴市本级	23.9	0.59	15.92	67%	/	/	/	/	/	/
28	南湖区	1.4	0.13	0.91	65%	4963	1590	2004	1472	40%	93%
29	秀洲区	6	2.24	4.43	74%	4482	2040	3062	1980	68%	97%
30	海宁市	2.6	0.32	2.64	102%	6806	2071	4574	2071	67%	100%
31	平湖市	2.1	0.57	1.66	79%	2956	896	2570	570	87%	64%
32	桐乡市	1.5	0.25	1.29	86%	11586	4080	6902	4080	60%	100%
33	嘉善县	3.3	0.96	3.06	93%	10099	2650	2950	2280	29%	86%
34	海盐县	4.2	0.79	5.47	130%	2820	1523	2700	1403	96%	92%
六	湖州	18	5.87	20.20	112%	89259	23258	80109	22649	90%	97%
35	湖州市本级	2.3	1.11	2.26	98%	/	/	/	/	/	/
36	吴兴区	1.5	0.21	1.53	102%	3200	1070	2260	850	71%	79%
37	南浔区	1.8	0.80	2.84	158%	14045	3877	12017	3877	86%	100%
38	德清县	5	2.34	5.05	101%	46960	11806	42487	11417	90%	97%
39	安吉县	2	0.69	1.75	88%	5649	2620	4985	2620	88%	100%
40	长兴县	5.4	0.72	6.77	125%	19405	3885	18360	3885	95%	100%
七	绍兴	65	9.71	50.04	77%	16796	5681	13108	5240	78%	92%
41	绍兴市本级	7.5	4.08	4.39	59%	/	/	/	/	/	/
42	越城区	17.5	0.00	10.71	61%	480	120	270	90	56%	75%
43	柯桥区	9.5	2.11	8.16	86%	650	480	650	480	100%	100%
44	上虞区	9	0.85	8.13	90%	190	100	114	100	60%	100%
45	诸暨市	10.5	1.44	8.72	83%	9059	2411	7927	2315	88%	96%
46	嵊州市	7.5	0.75	5.11	68%	977	300	912	250	93%	83%
47	新昌县	3.5	0.48	4.82	138%	5440	2270	3235	2005	59%	88%
八	金华	29	5.39	19.73	68%	50329	13301	25231	10948	50%	82%
48	金华市本级	3.2	0.84	1.55	49%	10	10	10	10	100%	100%
49	婺城区	3.5	0.17	1.67	48%	11181	2905	8555	2905	77%	100%
50	金东区	3.1	0.29	1.91	62%	20074	1610	6300	1610	31%	100%
51	兰溪市	5.2	2.46	2.76	53%	998	195	676	135	68%	69%
52	东阳市	2.6	0.42	2.02	78%	3281	1940	3281	1940	100%	100%
53	义乌市	5.2	0.23	4.64	89%	818	390	721	293	88%	75%
54	永康市	2.6	0.27	2.19	84%	5319	2670	3610	2260	68%	85%
55	浦江县	1.2	0.25	0.91	76%	2191	1421	1433	1215	65%	86%
56	武义县	1.2	0.28	1.21	101%	5012	1540	575	560	11%	36%
57	磐安县	1.2	0.18	0.87	72%	1445	620	70	20	5%	3%
九	舟山	24	4.87	17.53	73%	37458	8510	28238	7491	75%	88%

序号	市、县(市、区)	年度投资计划及完成情况				中央投资计划及完成情况					
		年度目标	省级资金	1~8月完成投资	1~8月投资完成率	年度计划	中央资金	完成年度计划	完成中央资金	年度计划完成率	中央资金完成率
		亿元	亿元	亿元		万元	万元	万元	万元		
58	舟山市本级	5.4	1.54	4.00	74%	538	80	62	62	11%	77%
59	定海区	2.8	1.69	2.32	83%	18029	3550	17046	3335	95%	94%
60	普陀区	4.2	0.87	3.27	78%	15290	2940	8952	2644	59%	90%
61	岱山县	11.2	0.59	7.65	68%	3300	1640	2068	1340	63%	82%
62	嵊泗县	0.4	0.17	0.29	72%	300	300	110	110	37%	37%
十	台州	75	11.80	38.04	51%	14381	6240	6885	4237	48%	68%
63	台州市本级	32.6	3.97	15.82	49%	/	/	/	/	/	/
64	椒江区	3.8	0.10	2.85	75%	280	280	73	73	26%	26%
65	黄岩区	5.3	1.63	0.76	14%	827	430	280	280	34%	65%
66	路桥区	4.6	1.62	2.93	64%	220	220	120	120	55%	55%
67	温岭市	4.6	1.05	3.17	69%	1420	525	907	273	64%	52%
68	临海市	8.5	1.18	3.69	43%	175	175	90	90	51%	51%
69	三门县	3	0.63	0.52	17%	6080	1390	933	523	15%	38%
70	天台县	6.2	0.57	3.81	61%	656	290	590	290	90%	100%
71	仙居县	4.2	0.97	2.71	65%	4334	2540	3674	2370	85%	93%
72	玉环市	2.2	0.08	1.78	81%	390	390	219	219	56%	56%
十一	衢州	26	10.89	14.91	57%	48564	12235	34489	11615	71%	95%
73	衢州市本级	2	0.55	0.77	38%	1218	320	70	70	6%	22%
74	柯城区	3	1.17	1.26	42%	572	300	522	250	91%	83%
75	衢江区	3.3	0.89	2.36	72%	21151	4295	11711	4295	55%	100%
76	江山市	5.7	2.96	3.45	61%	3263	1810	1749	1690	54%	93%
77	龙游县	5	1.56	2.59	52%	7800	2150	4020	2070	52%	96%
78	常山县	4	1.87	2.38	59%	3054	1420	2099	1420	69%	100%
79	开化县	3	1.89	2.11	70%	11507	1940	14319	1820	124%	94%
十二	丽水	29	7.12	19.83	68%	46548	22143	26897	17700	58%	80%
80	丽水市本级	6.3	0.23	2.43	39%	/	/	/	/	/	/
81	莲都区	2.8	0.40	0.87	31%	3885	1820	1670	1480	43%	81%
82	龙泉市	2	1.11	1.77	89%	8609	2960	5889	2870	68%	97%
83	青田县	4	0.34	2.73	68%	6492	1090	1720	840	26%	77%
84	云和县	1	0.27	0.66	66%	8159	2893	3410	1560	42%	54%
85	庆元县	2.7	0.85	1.84	68%	2500	2500	1910	1910	76%	76%
86	缙云县	3.2	1.47	3.50	109%	3070	3070	2780	2780	91%	91%
87	遂昌县	2	0.99	2.11	106%	9993	4820	6748	4070	68%	84%
88	松阳县	4	1.14	3.14	78%	2130	2130	1590	1590	75%	75%
89	景宁县	1	0.33	0.78	78%	1710	860	1180	600	69%	70%

2018年“百项千亿”水利项目进展情况表（建设类）

单位：万元

序号	县市区	项目名称	总投资	截至2017 年底累计 完成投资	2018年计划		
					年度 目标	1-8月完 成投资	年度目标 完成率
合计			16585735	4509851	2300000	1458839	63.4%
1	杭州、嘉兴、湖州	扩大杭嘉湖南排工程	792735	516097	88000	64559	73%
(1)	杭州市 本级	扩大杭嘉湖南排八堡排水泵站 工程	129000	/	10000	10000	100%
(2)	嘉兴市 本级	扩大杭嘉湖南排工程（嘉兴部 分）	454300	310431	70000	48090	69%
(3)	德清县	扩大杭嘉湖南排工程（德清部 分）	100805	92636	8000	6469	81%
2	湖州	苕溪清水入湖河道整治工程	740000	432958	30000	25969	87%
(1)	长兴县	苕溪清水入湖河道整治工程 （长兴段）	289418	263430	25000	21180	85%
(2)	安吉县	苕溪清水入湖河道整治工程 （安吉段）	185600	169528	5000	4789	96%
3	湖州市 本级	苕溪清水入湖河道整治后续工 程	218000	30000	5000	10000	200%
4	柯桥区	柯桥区瓜渚湖直江柯北段拓浚 工程	116000	33000	70000	75550	108%
5	永嘉县	温州市乌牛溪（永乐河）治理 工程	72000	28223	23000	20713	90%
6	杭州市 本级	杭州市大江东钱塘江标准塘工 程	102000	78371	25300	22661	90%
7	鹿城区	鹿城区戍浦江河道（藤桥至河 口段）整治工程	91000	76530	29000	24000	83%
8	缙云县	缙云县潜明水库一期工程	161000	107800	27000	21900	81%
9	瑞安市	瑞安市飞云江治理一期工程	96000	101308	12000	9666	81%
10	台州市 本级	台州市东官河综合整治工程	233000	139521	50000	40260	81%
11	奉化市	宁波市葛岙水库工程	442000	/	80000	64100	80%
12	余姚市	余姚市姚江城区段堤防加固工 程	86000	/	20000	16000	80%
13	嵊州市	嵊州市湛头滞洪区改造工程	129000	90000	28800	22980	80%
14	龙湾区 经开区	温州市温瑞平原东片排涝工程	355000	74793	17000	13581	80%
15	萧山区	杭州市萧山区浦阳江治理工程	425000	197932	56000	43446	78%
16	青田县	青田县青田水利枢纽工程	160000	101900	20000	15500	78%

序号	县市区	项目名称	总投资	截至2017 年底累计 完成投资	2018年计划		
					年度 目标	1-8月完 成投资	年度目标 完成率
17	鹿城区	鹿城区瓯江绕城高速至卧旗山 段海塘加固工程	188000	108640	50000	38738	77%
18	萧山区	杭州市萧山区蜀山片外排工程	172000	5000	11000	8504	77%
19	苍南县	苍南县江南垟平原骨干排涝工 程	242000	34890	20000	15180	76%
20	宁波市 本级	宁波市姚江二通道（慈江）工 程	248000	/	70000	52304	75%
21	文成县	文成县飞云江治理工程二期	27000	19000	8300	6157	74%
22	上虞区	上虞区虞北平原滨江河-沥北 河整治工程	95000	89030	8000	5855	73%
23	松阳县	松阳县黄南水库工程	181000	104442	38000	27600	73%
24	海盐县	海盐县东段围涂标准海塘工程	34000	6084	25000	17898	72%
25	越城区	绍兴市新三江闸排涝配套河道 拓浚工程（越城片）	262000	129284	70000	49400	71%
26	临海市	临海市大田平原排涝一期工程	133000	96614	20000	14010	70%
27	龙游县	龙游县高坪桥水库工程	99000	61000	23000	16100	70%
28	富阳区	杭州市富阳区富春江治理工程	289000	152944	25000	17500	70%
29	仙居县	仙居县孟溪水库工程	27000	34650	1000	700	70%
30	平阳县	鳌江干流治理平阳县水头段防 洪工程	167000	47005	44000	30740	70%
31	浙东局	姚江上游西排工程	123000	37842	25000	17401	70%
32	嘉兴市 本级	嘉兴市平湖塘延伸拓浚工程	357000	320135	25000	17390	70%
33	上虞区	上虞区虞东河湖综合整治工程	120000	53500	27500	19065	69%
34	慈溪市	慈溪市北排工程	612000	/	70000	48425	69%
35	龙泉市	龙泉市龙泉溪治理二期工程	27000	15661	9500	6400	67%
36	余姚市	余姚市扩大北排工程	450000	/	40000	26850	67%
37	临海市	临海市方溪水库工程	115000	91634	15000	10009	67%
38	兰溪市	兰溪市钱塘江堤防加固工程	136000	65000	25000	16650	67%
39	建德市	建德市新安江、兰江治理工程	17000	12818	10000	6654	67%
40	江山市	江山市江山港综合治理工程	224000	33008	40000	26410	66%

序号	县市区	项目名称	总投资	截至2017 年底累计 完成投资	2018年计划		
					年度 目标	1-8月完 成投资	年度目标 完成率
41	乐清市	乐清市乐柳虹平原排涝工程	170000	5050	3000	1966	66%
42	诸暨市	诸暨市浦阳江治理二期工程	74000	12000	35000	22750	65%
43	鹿城区 瓯海区	温州市温瑞平原西片排涝工程	246000	64525	60000	38507	64%
44	宁波市 本级	宁波市鄞奉平原排涝工程	715000	/	140000	89706	64%
45	嘉善县 秀洲区	嘉兴市北部湖荡整治及河湖连通工程	250000	15739	57000	36369	64%
46	丽水市 本级	丽水市大溪治理工程	77000	63808	2000	1247	62%
47	嘉兴市 本级	嘉兴市南排闸站除险加固工程	33000	10081	5300	3286	62%
48	杭州市 本级	杭州市大江东片外排工程	121000	32900	30000	18500	62%
49	诸暨市	诸暨市高湖蓄滞洪区改造工程	220000	160500	40000	24281	61%
50	遂昌县	遂昌县清水源水库工程	58000	6000	15000	9000	60%
51	庆元县	庆元县兰溪桥水库扩建工程	150000	/	15000	8800	59%
52	平湖市	平湖市白沙湾至水口标准海塘工程	35000	/	10000	5700	57%
53	越城区	绍兴市袍江片东入曹娥江排涝工程	256000	112000	20000	11240	56%
54	绍兴市 本级	绍兴市马山闸强排及配套河道建设工程	233000	/	100000	55500	56%
55	平阳县	平阳县瑞平原排涝工程	140000	/	10000	5500	55%
56	台州市 本级	台州市朱溪水库工程	374000	113800	90000	47298	53%
57	余姚市	余姚市姚江上游西分工程	195000	/	30000	15500	52%
58	定海区	舟山群岛新区定海强排工程	72000	14166	21400	10819	51%
59	永嘉县	永嘉县瓯北三江标准堤工程	173000	100821	15000	7546	50%
60	常山县	常山县常山港治理二期工程	88000	10158	30000	12510	42%
61	柯城区	衢州市柯城区常山港治理工程	100000	1700	20000	7000	35%
62	衢州市	衢州市本级衢江治理二期工程	142000	54300	25000	8370	33%
63	金华市 本级	金华市本级金华江治理二期工程	93000	9300	10000	3000	30%
64	丽水市 本级	丽水市大溪治理提升改造工程	100000	2000	17000	4860	29%

序号	县市区	项目名称	总投资	截至2017 年底累计 完成投资	2018年计划		
					年度 目标	1-8月完 成投资	年度目标 完成率
65	龙游县	龙游县衢江治理二期工程	54000	20800	20000	5000	25%
66	三门县	三门县东屏水库工程	70000	24664	15000	3371	22%
67	温岭市	温岭市南排工程	364000	25200	30000	5460	18%
68	桐庐县	桐庐县富春江干堤加固二期工程	51000	24789	1500	200	13%
69	椒江区	台州市洪家场浦强排工程	217000	26300	50000	5000	10%
70	桐庐县	桐庐县富春江干堤加固三期工程	24000	1000	4500	350	8%
71	路桥区	台州市路桥区青龙浦排涝工程	210000	50578	45000	2178	5%
72	黄岩区	台州市黄岩区北排工程	315000	13650	30000	1000	3%
73	台州市 本级	台州市永宁江闸强排工程	115000	2850	20000	200	1%
74	台州市 本级	台州市七条河拓浚工程	156000	3400	20000	0	0%
75	临海市	临海市大田平原排涝二期工程	270000	/	5000	外排工程可研已批，未开工	
76	上虞区	绍兴市上虞区崧北河综合治理工程	66000	/	3000	可研已批，未开工	
77	临安区	临安区双溪口水库工程	51000	1160	5000	可研已批，未开工	
78	临海市	临海市东部平原排涝工程	179000	/	5000	一期可研已批，未开工	
79	河道总站 钱管局	海宁市秧田庙至塔山坝段海塘工程	20000	/	新开工	堤脚加固初设已审	
80	瑞安市	瑞安市温瑞平原南部排涝工程	200000	/	2000	一期可研已审意见已出，已报省发改	
81	鹿城区	温州市鹿城区瓯江治理二期工程	90000	/	新开工	可研已审	
82	台州市 本级	台州市灵江扩排挡潮工程	1047000	/	15000	一期可研在编	
83	青田县	青田县瓯江治理二期工程	21000	/	5000	可研已审意见已出，已报省发改委	
84	苍南县 平阳县	温州市江西垟平原排涝工程	187000	/	5000	一期可研意见已出，已报省发改	
85	绍兴市 本级	绍兴市曹娥江综合整治工程	200000	/	5000	可研已审	

注：年度完成率低于全省平均的为滞后项目，其中红色为严重滞后，黄色为一般滞后。

2018年“百项千亿”水利项目进展情况表（前期类）

序号	县（市、区）	项目名称	年度目标	当月计划目标	1-8月完成情况	进展情况
1	湖州市本级	太嘉河及杭嘉湖环湖河道整治后续工程	力争完成可研批复	力争完成可研批复	可研已批	正常
2	湖州市本级	环湖大堤（浙江段）后续工程	按照国家要求开展，力争完成可研批复	按照国家要求开展	可研已复审，移民安置规划报告已报部	正常
3	开化县	开化县开化水库工程	按照国家要求开展，力争完成可研批复	按照国家要求开展	可研已复审，移民大纲已审	正常
4	宁海县 天台县 三门县	清溪水库工程	加快推进可研工作	开展可研编制	可研在编	正常
5	磐安县	磐安县流岸水库工程	完成可研批复	完成环境影响评价、土地预审等专题评审和报批	可研已审意见已出；规划选址已办理	正常
6	义乌市	双江水利枢纽工程	完成可研批复	完成土地预审批复	可研已审；规划选址已办理	正常
7	永嘉县	永嘉县南岸水库	按照国家要求开展	按照国家要求开展	可研在编	正常
8	嘉善县	嘉兴市中心河拓浚及河湖连通工程	完成可研批复	完成规划选址批复	可研已审意见已出；规划选址已办理	正常
9	嘉兴市本级	太浦河后续工程（浙江段）	按照国家要求开展	按照国家要求开展	可研在编	正常
10	温岭市	温岭九龙汇调蓄工程	完成可研审查，力争完成可研批复	开展可研编制	可研在编	正常
11	龙湾区	温州市龙湾区瓯江标准海塘提升改造工程	完成可研批复	完成环评、水保专题批复	可研已审	正常
12	临海市	台州市椒江治理工程（临海段）	完成可研批复	完成规划选址批复	可研已审	滞后
13	磐安县 永康市	磐安县虬里水库工程	加快推进可研工作	开展可研编制	可研在编	滞后
14	瑞安市	瑞安市飞云江治理二期工程	完成可研批复	完成规划选址上报、土地预审组件编制	可研已审	滞后
15	台州市本级	台州市金清港强排工程	加快推进可研工作	开展可研编制	可研在编	滞后

注：年度完成率低于全省平均的为滞后项目，其中红色为严重滞后，黄色为一般滞后。
