

全省水利统计简报


(1-6月)


厅规划计划处

2018年7月10日

一、全省水利建设投资完成情况

2018年全省水利建设计划完成投资500亿元。至6月底，全省水利建设完成投资258.0亿元，完成率51.6%。全省水利工程管理经费投入23.5亿元，其中：河湖库塘清淤15.2亿元，水利工程运行维护费8.3亿元。

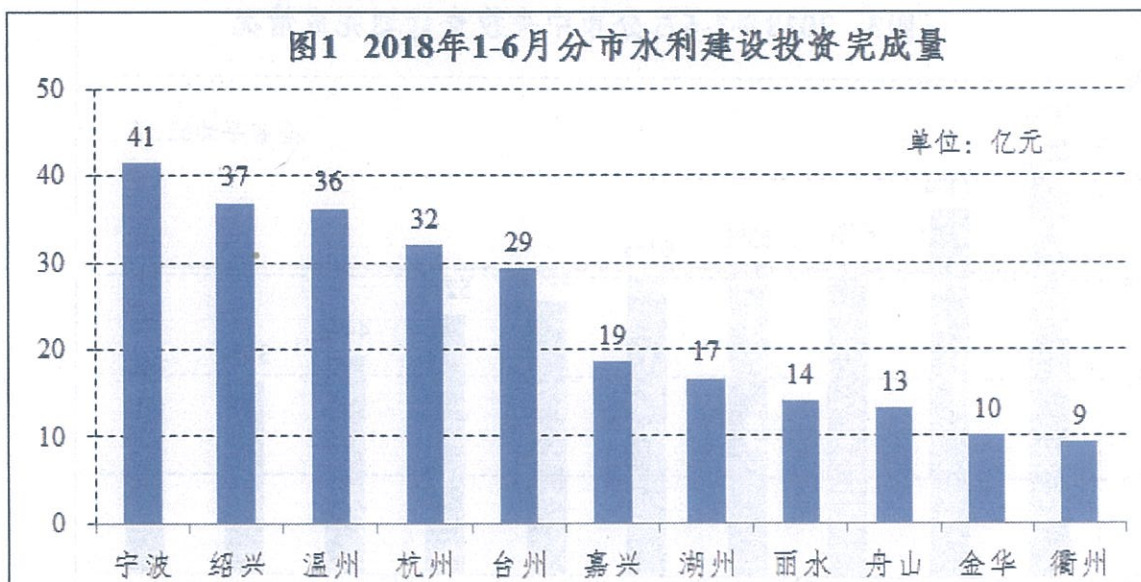


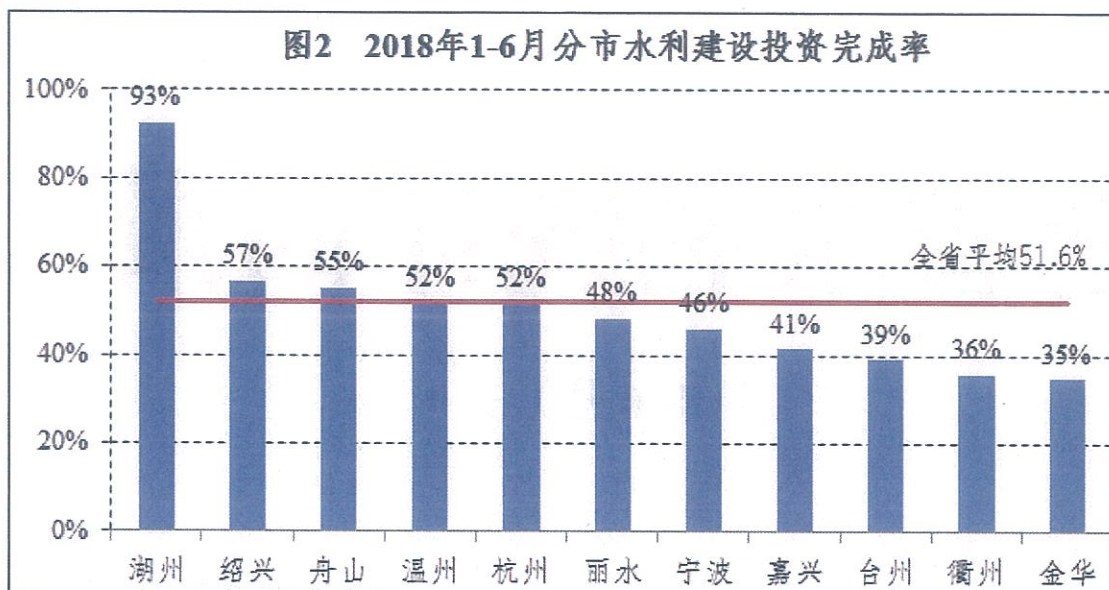

二、中央水利投资计划执行进展情况

2018年进展情况：至6月底，中央下达我省2018年投资计划37.3亿元，其中中央资金11.7亿元；完成投资23.1亿元，完成率61.8%，完成中央资金8.5亿元、完成率72.7%。

从分类看，大中型病险水库水闸加固、独流入海河流治理、小型水库除险加固、中小河流治理及重点县完成率较高（80%以上）；水资源节约保护完成率较低（50%以下）。

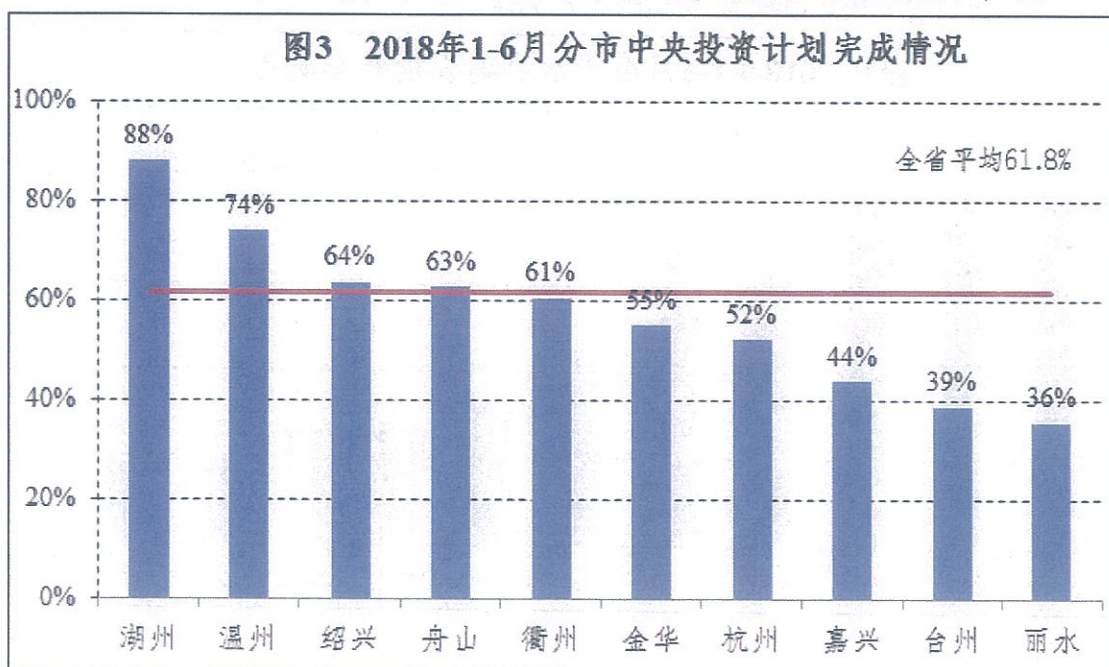

2018 年度中央项目分类型完成情况



单位：万元

序号	类型名称	计划下达		投资完成		完成率	
		年度计划	中央资金	计划完成	中央完成	年度计划	中央资金
总计		373518	117198	230840	85301	62%	73%
一	中央预算内项目	48900	11900	43277	10500	88.5%	88%
1	大中型病险水闸除险加固	2000	1200	1363	1200	68.2%	100%
2	大中型病险水库除险加固	6900	2300	4555	2300	66.0%	100%
3	独流入海河流治理	40000	8400	37359	7000	93.4%	83%
二	中央财政资金	324618	105298	187563	74801	57.8%	71%
1	小型病险水库除险加固	16587	2930	9659	2734	58.2%	93%
2	中小河流治理及重点县	172167	42540	118922	33917	69.1%	80%
3	小型农田水利建设	97811	38755	43077	26934	44.0%	69%
4	水土流失治理	7956	3250	3004	2245	37.8%	69%
5	农村基层防汛预报预警体系	4678	1053	2112	675	45.1%	64%
6	山洪灾害防治	4490	2370	2047	1483	45.6%	63%
7	圩区标准化养护	4473	3077	1809	1809	40.4%	59%
8	河长制奖励资金	7619	4000	3315	2054	43.5%	51%
9	水资源节约保护	8836	7323	3619	2951	41.0%	40%

三、百项千亿防洪排涝工程建设进展情况

1-6 月，全省百项千亿防洪排涝工程在建 67 项，完成水利投资 101.7 亿元，年度投资完成率 44.2%。宁波、绍兴分别完成投资 22.9 亿元、20.9 亿元，杭州、绍兴、宁波、湖州等 4 市完成年度投资计划 50% 以上，已达到时序进度要求。台州、衢州、嘉兴等 3 市年度投资完成率低于 30%，已明显滞后进度要求。另，路桥青龙浦排涝、温岭南排、柯城常山港等 19 项年度投资完成率不到 30%。

加快推进前期 22 项，开化县开化水库移民安置规划大纲上报水利部，磐安流岸水库、台州椒江治理始丰溪段规划选址已批复。可研已批未开工 11 项，各地要抓紧做好各项开工准备工作，及早开工建设。

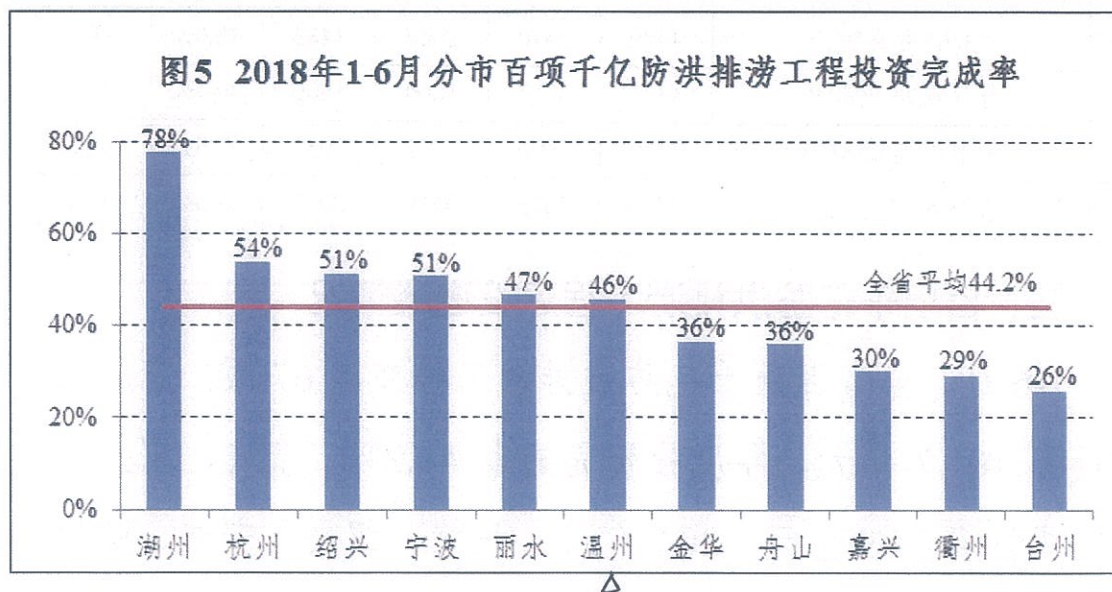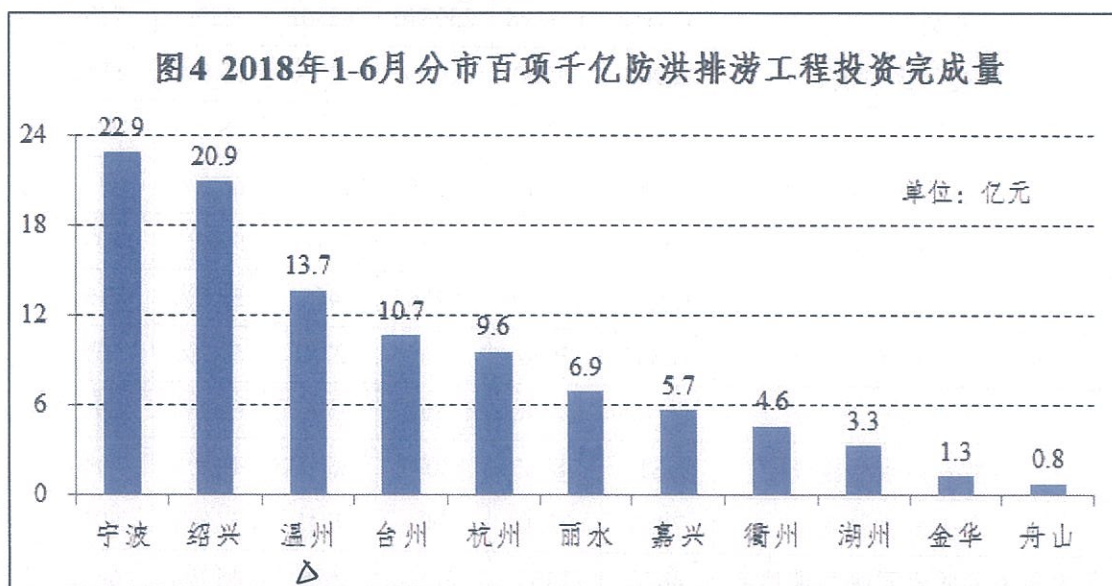

四、面上建设任务指标完成情况

海塘干堤加固：全年计划完成 100 公里，已完工 56.2 公里、完成率 56.2%；其中海塘 6 公里、干堤 50.2 公里；

水库加固：全年计划完成 100 座，已完成 65 座、完成率 65.0%；

圩区整治：全年计划完成 30 亩，已完成 16.7 万亩、完成率 55.7%；

山塘整治：全年计划完成 500 座，已完成 262 座、完成率 52.4%。

农村饮水安全提升：全年计划完成 100 万人，已完成 54.3 万人、完成率 54.3%。

高效节水面积：全年计划完成 25 万亩，已完成 16.1 万亩、完成率 64.4%。

小水电站生态治理：全年计划完成 19 座，已完成 9 座、完成率 47.6% ；

河道综合整治：全年计划完成 500 公里，已完成 338.2 公里，完成率 67.7%；河湖库塘清淤：全年计划完成 7000 万方，已完成 5156.4 万方、完成率 73.7%。

五、面上资金分解情况

2017 年 10 月提前下达 2018 年第一批面上省级资金，尚有 14 个县市区未完成分解。3 月下达的第二批面上资金，全省近一半县（市、区）未完成分解工作。各地要按照有关文件要求，商同级财政尽快分解下达面上任务和资金，并按要求抄送省水利厅、财政厅。

2018年面上水利建设与管理任务省级资金分解情况

序号	地市	未完成第一批分解地区	未完成第二批分解地区
1	杭州	萧山区、余杭区、建德市	市本级、萧山区、建德市
②	温州	鹿城区、瓯海区、文成县	鹿城区、瓯海区、龙湾区、瑞安市、永嘉县、平阳县、苍南县、文成县
3	嘉兴	南湖区	市本级、南湖区、秀洲区、嘉善县、海盐县
4	绍兴	新昌市	市本级、柯桥区
5	金华	兰溪市、东阳市、永康市	市本级、婺城区、兰溪市、东阳市、义乌市、永康市、武义县
6	舟山	普陀区	市本级、定海区、岱山县、嵊泗县
7	台州	市本级、椒江区、天台县	市本级、椒江区、黄岩区、临海市、天台县
8	衢州	/	江山市、龙游县、常山县、开化县
9	丽水	/	市本级、莲都区、龙泉市、云和县、庆元县、遂昌县、松阳县、景宁县

- 附件：1. 2018年全省水利建设投资完成情况表
2. 2018年全省百项千亿水利项目进展情况表（建设类）
3. 2018年全省百项千亿水利项目进展情况表（前期类）

2018年全省水利建设投资完成情况表

序号	市、县(市、区)	年度投资计划及完成情况				中央投资计划及完成情况					
		年度目标	省级资金	1~6月完成投资	1~6月投资完成率	中央投资计划	中央资金	完成中央投资	完成中央资金	中央投资完成率	中央资金完成率
		亿元	亿元	亿元		万元	万元	万元	万元		
	总计	500	81.03	258.02	52%	373518	117198	230840	85301	62%	73%
一	省本级	/	/	/	/	1523	1323	199	179	13%	14%
1	省本级	/	/	/	/	1523	1323	199	179	13%	14%
二	杭州	62	9.07	32.00	52%	22851	7940	11985	5878	52%	74%
2	杭州市本级	29	1.64	15.80	54%	/	/	/	/	/	/
3	萧山区	8	4.61	5.22	65%	/	/	/	/	/	/
4	余杭区	6	0.24	2.70	45%	220	220	60	60	27%	27%
5	富阳区	5.5	0.35	1.42	26%	1127	200	663	170	59%	85%
6	桐庐县	2.5	0.28	0.99	40%	880	190	616	190	70%	100%
7	建德市	3.8	0.61	1.34	35%	6116	1760	848	848	14%	48%
8	淳安县	2.2	0.76	1.84	84%	12278	3340	7988	2800	65%	84%
9	临安区	5	0.58	2.69	54%	2230	2230	1810	1810	81%	81%
三	宁波	90	/	41.50	46%	/	/	/	/	/	/
10	宁波市本级	54	/	23.73	44%	/	/	/	/	/	/
11	慈溪市	9	/	5.40	60%	/	/	/	/	/	/
12	余姚市	10	/	4.87	49%	/	/	/	/	/	/
13	宁海县	12	/	5.29	44%	/	/	/	/	/	/
14	象山县	5	/	2.20	44%	/	/	/	/	/	/
四	温州	70	10.48	36.25	52%	69183	17970	51314	12967	74%	72%
15	温州市本级	11.2	0.50	5.36	48%					/	/
16	鹿城区	9.3	1.04	4.95	53%	4000	800	2000	0	50%	0%
17	瓯海区	6.5	0.63	3.92	60%	3118	1050	1882	1050	60%	100%
18	龙湾区	2.6	0.23	1.26	49%	170	170	50	50	29%	29%
19	洞头区	0.8	0.03	0.51	64%	380	100	260	100	68%	100%
20	乐清市	6.5	0.10	3.32	51%	3953	990	2914.6	391.61	74%	40%
21	瑞安市	5.5	0.87	2.71	49%	/	/	/	/	/	/
22	永嘉县	7.2	1.21	3.82	53%	/	/	/	/	/	/
23	平阳县	10.2	3.73	5.23	51%	22045	5550	20202	3450	92%	62%
24	苍南县	6.3	1.06	2.73	43%	12300	3560	10998	3275	89%	92%
25	文成县	1.7	0.32	0.94	56%	18000	3700	11907	3550	66%	96%
26	泰顺县	2.2	0.75	1.49	68%	5216.6	2050	1100	1100	21%	54%
五	嘉兴	45	5.84	18.67	41%	42466	14363	18685	10584	44%	74%

序号	市、县(市、区)	年度投资计划及完成情况				中央投资计划及完成情况					
		年度目标	省级资金	1~6月完成投资	1~6月投资完成率	中央投资计划	中央资金	完成中央投资	完成中央资金	中央投资完成率	中央资金完成率
		亿元	亿元	亿元		万元	万元	万元	万元		
27	嘉兴市本级	23.9	0.59	6.91	29%	/	/	/	/	/	/
28	南湖区	1.4	0.13	0.43	31%	4963.2	1590	770	770	16%	48%
29	秀洲区	6	2.24	1.73	29%	4482	2040	2496	1935	56%	95%
30	海宁市	2.6	0.32	1.67	64%	5865	1890	3153.8	1615.8	54%	85%
31	平湖市	2.1	0.57	0.93	44%	2750	690	2560	560	93%	81%
32	桐乡市	1.5	0.25	0.97	65%	11586	4080	5295	3020	46%	74%
33	嘉善县	3.3	0.96	1.83	55%	9999	2550	2050	1620	21%	64%
34	海盐县	4.2	0.79	4.19	100%	2820	1523	2360	1063	84%	70%
六	湖州	18	5.87	16.67	93%	68717	17422	60703	16004	88%	92%
35	湖州市本级	2.3	1.11	1.70	74%	/	/	/	/	/	/
36	吴兴区	1.5	0.21	1.34	90%	3200	1070	1952	720	61%	67%
37	南浔区	1.8	0.80	2.61	145%	11809	3782	10518	3474	89%	92%
38	德清县	5	2.34	4.47	89%	28719	6130	26763	5550	93%	91%
39	安吉县	2	0.69	1.54	77%	5648.8	2620	4635	2600	82%	99%
40	长兴县	5.4	0.72	5.01	93%	19340	3820	16835	3660	87%	96%
七	绍兴	65	9.71	36.90	57%	15918	5070	10153	4425	64%	87%
41	绍兴市本级	7.5	4.08	2.27	30%	/	/	/	/	/	/
42	越城区	17.5	0.00	9.23	53%	480	120	160	60	33%	50%
43	柯桥区	9.5	2.11	5.47	58%	650	480	565	480	87%	100%
44	上虞区	9	0.85	6.45	72%	190	100	15	15	8%	15%
45	诸暨市	10.5	1.44	5.57	53%	8848	2200	7217	2140	82%	97%
46	嵊州市	7.5	0.75	4.36	58%	680.48	270	390	90	57%	33%
47	新昌县	3.5	0.48	3.55	102%	5070	1900	1806	1640	36%	86%
八	金华	29	5.39	10.13	35%	26700	10970	14758	6633	55%	60%
48	金华市本级	3.2	0.84	0.96	30%	/	/	/	/	/	/
49	婺城区	3.5	0.17	0.56	16%	7104	970	5790	970	82%	100%
50	金东区	3.1	0.29	0.40	13%	1610	1610	50	50	3%	3%
51	兰溪市	5.2	2.46	1.43	28%	640.82	100	640.82	100	100%	100%
52	东阳市	2.6	0.42	1.08	42%	3281	1940	3281	1940	100%	100%
53	义乌市	5.2	0.23	2.78	54%	818	390	721	293	88%	75%
54	永康市	2.6	0.27	1.49	57%	5319	2670	2950	2200	55%	82%
55	浦江县	1.2	0.25	0.83	69%	1620	1280	1120	930	69%	73%
56	武义县	1.2	0.28	0.30	25%	4881.8	1410	155	150	3%	11%
57	磐安县	1.2	0.18	0.30	25%	1425	600	50	0	4%	0%
九	舟山	24	4.87	13.26	55%	37378	8430	23511	6093.8	63%	72%

序号	市、县(市、区)	年度投资计划及完成情况				中央投资计划及完成情况					
		年度目标	省级资金	1~6月完成投资	1~6月投资完成率	中央投资计划	中央资金	完成中央投资	完成中央资金	中央投资完成率	中央资金完成率
		亿元	亿元	亿元		万元	万元	万元	万元		
58	舟山市本级	5.4	1.54	3.04	56%	538.38	80	31.78	31.78	0.059	0.3973
59	定海区	2.8	1.69	1.75	62%	17949	3470	16022	2910	89%	84%
60	普陀区	4.2	0.87	2.47	59%	15290	2940	5837	1712	38%	58%
61	岱山县	11.2	0.59	5.76	51%	3300	1640	1520	1340	46%	82%
62	嵊泗县	0.4	0.17	0.24	60%	300	300	100	100	33%	33%
十	台州	75	11.80	29.31	39%	12604	5510	4904.6	3772.5	39%	68%
63	台州市本级	32.6	3.97	13.28	41%	/	/	/	/	/	/
64	椒江区	3.8	0.10	2.28	60%	220	220	68	68	31%	31%
65	黄岩区	5.3	1.63	0.57	11%	650	350	280	280	43%	80%
66	路桥区	4.6	1.62	1.58	34%	220	220	80	80	36%	36%
67	温岭市	4.6	1.05	2.48	54%	750	440	400.13	148	53%	34%
68	临海市	8.5	1.18	2.79	33%	60	60	60	60	100%	100%
69	三门县	3	0.63	0.45	15%	5980	1290	893	483	15%	37%
70	天台县	6.2	0.57	2.43	39%	80	80	80	80	100%	100%
71	仙居县	4.2	0.97	1.87	44%	4254	2460	2825	2355	66%	96%
72	玉环市	2.2	0.08	1.57	72%	390	390	218.5	218.5	56%	56%
十一	衢州	26	10.89	9.29	36%	29646	8670	17992	6875	61%	79%
73	衢州市本级	2	0.55	0.37	18%	/	/	/	/	/	/
74	柯城区	3	1.17	0.77	26%	572	300	472	200	83%	67%
75	衢江区	3.3	0.89	1.33	40%	4040	1590	2485	1525	62%	96%
76	江山市	5.7	2.96	2.30	40%	2983	1530	1035	1014	35%	66%
77	龙游县	5	1.56	1.60	32%	7670	2070	2370	1070	31%	52%
78	常山县	4	1.87	1.29	32%	3054	1420	1640	1420	54%	100%
79	开化县	3	1.89	1.64	55%	11327	1760	9990.1	1646	88%	94%
十二	丽水	29	7.12	14.05	48%	46533	19530	16636	11890	36%	61%
80	丽水市本级	6.3	0.23	1.82	29%	/	/	/	/	/	/
81	莲都区	2.8	0.40	0.65	23%	3845	1780	1230	1230	32%	69%
82	龙泉市	2	1.11	1.25	63%	8499	2870	4275	2870	50%	100%
83	青田县	4	0.34	2.09	52%	11750	840	500	500	4%	60%
84	云和县	1	0.27	0.50	50%	5955.8	2690	2850	1250	48%	46%
85	庆元县	2.7	0.85	0.86	32%	2500	2500	725	725	29%	29%
86	缙云县	3.2	1.47	2.45	76%	2840	2840	1270	970	45%	34%
87	遂昌县	2	0.99	1.26	63%	8903	3830	4651	3220	52%	84%
88	松阳县	4	1.14	2.55	64%	2030	2030	1030	1030	51%	51%
89	景宁县	1	0.33	0.61	61%	210	150	105	95	50%	63%

2018年“百项千亿”水利项目进展情况表（建设类）

单位：万元

序号	县市区	项目名称	总投资	截至2017 年底累计 完成投资	2018年计划		
					年度 目标	1-6月完 成投资	年度目标 完成率
合计			16457000	4509851	2368100	1016935	44.2%
1	杭州、嘉兴、湖州	扩大杭嘉湖南排工程	664000	516097	88000	32079	36%
(1)	杭州市本级	扩大杭嘉湖南排八堡排水泵站工程	129000	/	10000	0	/
(2)	嘉兴市本级	扩大杭嘉湖南排工程（嘉兴部分）	454300	310431	70000	26617	38%
(3)	德清县	扩大杭嘉湖南排工程（德清部分）	100805	92636	8000	5462	68%
2	湖州	苕溪清水入湖河道整治工程	740000	432958	30000	20340	68%
(1)	长兴县	苕溪清水入湖河道整治工程（长兴段）	289418	263430	25000	16180	65%
(2)	安吉县	苕溪清水入湖河道整治工程（安吉段）	185600	169528	5000	4160	83%
3	湖州市本级	苕溪清水入湖河道整治后续工程	218000	30000	5000	7600	152%
4	杭州市本级	杭州市大江东钱塘江标准塘工程	102000	78371	25300	20040	79%
5	柯桥区	柯桥区瓜渚湖直江柯北段拓浚工程	116000	33000	70000	50000	71%
6	台州市本级	台州市东官河综合整治工程	233000	139521	50000	34510	69%
7	萧山区	萧山区浦阳江治理工程	425000	197932	56000	37954	68%
8	嵊州市	嵊州市湛头滞洪区改造工程	129000	90000	28800	19445	68%
9	青田县	青田县青田水利枢纽工程	160000	101900	20000	12700	64%
10	鹿城区	鹿城区瓯江绕城高速至卧旗山段海塘加固工程	188000	108640	50000	31358	63%
11	越城区	绍兴市新三江闸排涝配套河道拓浚工程（越城片）	262000	129284	70000	43200	62%
12	慈溪市	宁波市姚江二通道（慈江）工程	248000	/	70000	43148	62%
13	缙云县	好溪水利枢纽潜明水库一期工程	161000	107800	27000	16500	61%
14	松阳县	松阳县黄南水库工程	181000	104442	38000	23000	61%
15	上虞区	上虞区虞北平原滨江河-沥北河整治工程	95000	89030	8000	4695	59%
16	慈溪市	慈溪市北排工程	612000	/	70000	39135	56%

序号	县市区	项目名称	总投资	截至2017 年底累计 完成投资	2018年计划		
					年度 目标	1-6月完 成投资	年度目标 完成率
17	余姚市	余姚市姚江城区段堤防加固工程	86000	/	20000	11000	55%
18	上虞区	上虞区虞东河湖综合整治工程	120000	53500	27500	14965	54%
19	临海市	临海市方溪水库工程	115000	91634	15000	8029	54%
20	仙居县	仙居县孟溪水库工程	27000	34650	1000	530	53%
21	平阳县	鳌江干流治理平阳县水头段防洪工程	167000	47005	44000	23123	53%
22	文成县	文成县飞云江治理二期工程	27000	19000	8300	4357	52%
23	临海市	临海市大田平原排涝一期工程	133000	96614	20000	10450	52%
24	永嘉县	温州市乌牛溪(永乐河)治理工程	72000	28223	23000	11962	52%
25	萧山区	杭州市萧山区蜀山片外排工程	172000	5000	11000	5695	52%
26	杭州市 本级	杭州市大江东片外排工程	121000	32900	30000	15500	52%
27	浙东局	姚江上游西排工程	123000	37842	25000	12898	52%
28	平湖市	嘉兴市平湖塘延伸拓浚工程	357000	320135	25000	12887	52%
29	苍南县	苍南县江南垟平原骨干排涝工程	242000	34890	20000	10270	51%
30	宁波市 本级	宁波市鄞奉平原排涝工程	715000	/	140000	71448	51%
31	兰溪市	兰溪市钱塘江堤防加固工程	136000	65000	25000	12750	51%
32	龙游县	龙游县高坪桥水库工程	99000	61000	23000	11730	51%
33	富阳区	杭州市富阳区富春江治理工程	289000	152944	25000	12700	51%
34	龙泉市	龙泉市龙泉溪治理二期工程	27000	15661	9500	4800	51%
35	余姚市	余姚市扩大北排工程	450000	/	40000	20100	50%
36	瑞安市	瑞安市飞云江治理一期工程	96000	101308	12000	5931	49%
37	鹿城区 瓯海区	温州市温瑞平原西片排涝工程	246000	64525	60000	28553	48%
38	越城区	绍兴市马山闸强排及配套河道建设工程	233000	/	100000	47200	47%
39	海盐县	海盐县东段围涂标准海塘工程	34000	6084	25000	11273	45%
40	丽水市 本级	丽水市大溪治理工程	77000	63808	2000	895	45%

序号	县市区	项目名称	总投资	截至2017 年底累计 完成投资	2018年计划		
					年度 目标	1-6月完 成投资	年度目标 完成率
41	绍兴市 本级	绍兴市袍江片东入曹娥江排涝工程	256000	112000	20000	8900	45%
42	龙湾区 经开区	温州市温瑞平原东片排涝工程	355000	74793	17000	7512	44%
43	奉化市	宁波市葛岙水库工程	442000	/	80000	34300	43%
44	江山市	江山市江山港综合治理工程	224000	33008	40000	17107	43%
45	台州市 本级	台州市朱溪水库工程	374000	113800	90000	38058	42%
46	诸暨市	诸暨市浦阳江治理二期工程	74000	12000	35000	13800	39%
47	嘉兴市 本级	嘉兴市南排闸站除险加固工程	33000	10081	5300	1984	37%
48	建德市	建德市新安江、兰江治理工程	17000	12818	10000	3741	37%
49	舟山市 本级	舟山群岛新区定海强排工程	72000	14166	21400	7752	36%
50	鹿城区	鹿城区戍浦江河道(藤桥至河口段)整治工程	91000	76530	29000	10000	34%
51	余姚市	余姚市姚江上游西分工程	195000	/	30000	9500	32%
52	乐清市	乐清市乐柳虹平原排涝工程	170000	5050	3000	919	31%
53	遂昌县	遂昌县清水源水库工程	58000	6000	15000	4000	27%
54	丽水市 本级	丽水市大溪治理提升改造工程	100000	2000	17000	4510	27%
55	常山县	常山县常山港治理二期工程	88000	10158	30000	6760	23%
56	三门县	三门县东屏水库工程	70000	24664	15000	3371	22%
57	衢州市 本级	衢州市本级衢江治理二期工程	142000	54300	25000	5080	20%
58	庆元县	庆元县兰溪桥水库扩建工程	150000	/	15000	3000	20%
59	诸暨市	诸暨市高湖蓄滞洪区改造工程	220000	160500	40000	7118	18%
60	柯城区	衢州市柯城区常山港治理工程	100000	1700	20000	3500	18%
61	平阳县	平阳县瑞平平原排涝工程	140000	/	10000	1500	15%
62	桐庐县	桐庐县富春江干堤加固二期工程	51000	24789	1500	200	13%
63	温岭市	温岭市南排工程	364000	25200	30000	3840	13%
64	龙游县	龙游县衢江治理二期工程	54000	20800	20000	2150	11%
65	椒江区	台州市洪家场浦强排工程	217000	26300	50000	4500	9%

序号	县市区	项目名称	总投资	截至2017 年底累计 完成投资	2018年计划		
					年度 目标	1-6月完 成投资	年度目标 完成率
66	永嘉县	永嘉县瓯北三江标准堤工程	173000	100821	15000	1205	8%
67	秀洲区 嘉善县	嘉兴市北部湖荡整治及河湖连通工程	250000	15739	57000	4500	8%
68	路桥区	台州市路桥区青龙浦排涝工程	210000	50578	45000	2178	5%
69	黄岩区	台州市黄岩区北排工程	315000	13650	30000	1000	3%
70	台州市 本级	台州市永宁江闸强排工程	115000	2850	20000	200	1%
71	台州市 本级	台州市七条河拓浚工程	156000	3400	20000	0	0%
72	平湖市	平湖市白沙湾至水口标准海塘加固工程	35000	/	10000	可研已批，未开工	
73	临海市	临海市大田平原排涝二期工程	270000	/	5000	可研已批，未开工	
74	上虞区	绍兴市上虞区崧北河综合治理工程	66000	/	3000	可研已批，未开工	
75	临安区	临安区双溪口水库工程	51000	1160	5000	可研已批，未开工	
76	桐庐县	桐庐县富春江干堤加固三期工程	24000	1000	4500	可研已批，未开工	
77	金华市 本级	金华市本级金华江治理二期工程	93000	9300	10000	可研已批，未开工	
78	临海市	临海市东部平原排涝工程	179000	/	5000	一期可研已批，未开工	
79	瑞安市	瑞安市温瑞平原南部排涝工程	200000	/	2000	可研已审	
80	河道总站 钱管局	海宁市秧田庙至塔山坝段海塘工程	20000	/	新开工	初设已审	
81	台州市 本级	台州市灵江扩排挡潮工程	1047000	/	15000	可研在编	
82	鹿城区	温州市鹿城区瓯江治理二期工程	90000	/	新开工	可研已审	
83	青田县	青田县瓯江治理二期工程	21000	/	5000	可研已审	
84	绍兴市 本级	绍兴市曹娥江综合整治工程	200000	/	5000	可研已审	
85	苍南县 平阳县	温州市江西垟平原排涝工程	187000	/	5000	一、二期可研已审	

注：年度完成率低于全省平均的为滞后项目，其中红色为严重滞后，黄色为一般滞后。

2018年“百项千亿”水利项目进展情况表（前期类）

序号	县(市、区)	项目名称	年度目标	当月计划目标	1-6月完成情况	进展情况
1	湖州市本级	太嘉河及杭嘉湖环湖河道整治后续工程	力争完成可研批复	完成规划选址及土地预审等专题批复	可研已审; 规划选址等已批	正常
2	湖州市本级	环湖大堤(浙江段)后续工程	按照国家要求开展, 力争完成可研批复	按照国家要求开展	可研已审; 移民大纲已审	正常
3	嘉兴市本级	太浦河后续工程(浙江段)	按照国家要求开展	按照国家要求开展	可研在编	正常
4	开化县	开化县开化水库工程	按照国家要求开展, 力争完成可研批复	按照国家要求开展	可研已复审; 移民安置规划大纲已编	正常
5	龙湾区	温州市龙湾区瓯江标准海塘提升改造工程	完成可研批复	完成可研审查	可研已审	正常
6	宁海县 天台县 三门县	宁海县清溪水库工程	加快推进可研工作	开展可研编制	可研在编	正常
7	磐安县	磐安县流岸水库工程	完成可研批复	完成规划选址	可研已审; 规划选址已批	正常
8	温岭市	温岭九龙汇调蓄工程	完成可研审查, 力争完成可研批复	开展可研编制	可研已编	正常
9	永嘉县	永嘉县南岸水库	按照国家要求开展	按照国家要求开展	可研已编	正常
10	嘉善县	嘉兴市中心河拓浚及河湖连通工程	完成可研批复	完成规划选址批复	可研已审; 规划选址已批	滞后
11	磐安县	磐安县虬里水库工程	加快推进可研工作	开展可研编制	可研在编	滞后
12	瑞安市	瑞安市飞云江治理二期工程	完成可研批复	完成可研审查	可研已审	滞后
13	台州市本级	台州市金清港强排工程	加快推进可研工作	开展可研编制	可研在编	滞后
14	义乌市	双江水利枢纽工程	完成可研批复	完成规划选址批复	可研已审; 规划选址已批	滞后
15	临海市 天台县	台州市椒江治理工程	完成可研批复	始丰溪段完成规划选址等专题批复	可研已审; 始丰溪段规划选址等已批	临海段滞后



